



Município de Tubarão

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023

Termo de Fomento que entre si celebram o Município de Tubarão e a Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital Nossa Senhora da Conceição, através do Fundo Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência.

O **MUNICÍPIO DE TUBARÃO** inscrito no CGC/MF sob o nº 82.928.656/0001-33 e Inscrição Estadual nº (isenta), com sede na Rua Felipe Schmidt, nº 108, CEP: 88701-180, doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Interino Sr. **GELSON JOSÉ BENTO**, CPF nº 416.7XXXX9-15, por intermédio do Fundo Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência, através de seu Diretor-Presidente, Sr. **ANDRÉ FRETTA MAY**, e a **ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**, CNPJ nº 60.922.168/0053-07, doravante denominada simplesmente **INSTITUIÇÃO**, neste ato representada por seus Procuradores, o Sr. **DENILSON DE SANTA CLARA**, portador da carteira de identidade nº 4.7XXXX3-0-SSP/PR, e inscrito no CPF nº 726.4XXXX9-04 e a Sra. **ALLINE JORGETTO CEZARANI**, portadora da carteira de identidade nº 24.4XXXX7-3-SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 256.3XXXX8-69, conforme Memorando Eletrônico nº 2048/2023, resolvem celebrar o presente **TERMO DE FOMENTO**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este Termo tem por objeto o repasse de recursos financeiros para desenvolvimento do Projeto - Nas Mãos de Quem Ama - Fase 02, apresentado pela **ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO** na modalidade de Chancela, observada a legislação e o Plano de Trabalho da Instituição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

Este termo tem fundamentação legal na Resolução nº 07/23/CMDCA e na Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Instituição:

- I. Conduzir os serviços relacionados aos afins da Instituição;
- II. Estar em permanente contato com a Fundação Municipal de Desenvolvimento Social com vistas ao atendimento e ao bom andamento do presente Termo;
- III. Prestar contas ao Município dos recursos recebidos através deste Termo, obedecidos os termos da legislação e normas dadas pela municipalidade, e pela Lei Federal 13.019/2014.
- IV. Divulgar, em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com o poder público; a informação da parceria deverá conter o símbolo do concedente, número do Termo de Fomento, vigência, valor do Termo, conforme Anexo IV da Instrução Normativa 02/2022;
- V. Manter e garantir a organização, administração e funcionamento da entidade/unidade;
- VI. Garantir o atendimento ininterrupto todos os dias do mês/ano;

DS
DDSC

DS
ASC

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
Rua Felipe Schmidt, 108, Centro, Tubarão/SC – CEP 88701-180
Telefone (48) 3621-9000 – www.tubarao.sc.gov.br

[Handwritten signature]





Município de Tubarão


- VII. Planejar, coordenar e executar suas atividades, estabelecendo uma rotina de:
- (I) Distribuição de tarefas, (II) controle de qualidade de serviços, (III) recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, (IV) atividades administrativas que garantam o fluxo de atividades, transparência financeira e operacional e as devidas prestações de contas, (V) avaliação coletiva de suas ações;
- VIII. Manter pessoa de referência na área administrativa que garanta e acompanhe as exigências de habilitação jurídica e técnica (Planos de Trabalho, Relatórios Quantitativos, Documentos de Habilitação Jurídica);
- IX. Realizar procedimentos administrativos de forma eficaz, para; compra de material/adaptação das unidades, pequenos reparos, habilitação jurídica/prestação de contas, outras;
- X. Funcionar em espaço adequado executando as adaptações necessárias;
- XI. Manter e garantir a organização física da entidade/unidade;
- XII. Garantir acessibilidade conforme normas vigentes;
- XIII. Garantir a Segurança no atendimento através de: instalações elétricas embutidas; botijões de gás, produtos de limpeza, medicamentos, removedor e outros produtos tóxicos devidamente armazenados; corrimãos nas áreas de circulação; garantir que as janelas de depósitos tenham telas removíveis com fácil higienização;
- XIV. Zelar pela guarda e preservação dos materiais permanentes existentes.
- XV. Manter armário/equipamento/utensílios/vestuário em condições adequadas para o atendimento;
- XVI. Manter e garantir condições adequadas de higiene, nutrição e saúde;
- XVII. Instalar-se em imóvel que possua serviços de infraestrutura básica (esgoto, água potável, coleta de lixo);
- XVIII. Garantir o ambiente e as instalações sanitárias ventiladas e higienizadas, conforme recomendações da Vigilância Sanitária;
- XIX. Garantir alimentos acondicionados em lugar apropriado para sua conservação e o consumo planejado racionalmente de acordo com o grau de perecibilidade;
- XX. Garantir quadro mínimo de pessoal;
- XXI. A obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos na Lei nº 13.019/2014;
- XXII. O livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.

Município:

- I. Repassar os recursos financeiros à Instituição, conforme previsto na Cláusula Quarta;
- II. Controlar os recursos repassados acompanhando sua correta aplicação;
- III. Sustar o repasse dos recursos sempre que a Instituição prestar contas em desacordo com a legislação ou demais ajustes feitos com o Município, até sanar as falhas;
- IV. Sustar os recursos na hipótese de desvio das finalidades assistenciais da Entidade;
- V. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação;
- VI. Proceder aos pagamentos devidos à Instituição;
- VII. O Município não arcará com despesas relativas à estabilidade legal decorrente de acidente de trabalho, licença médica prolongada, licença maternidade, tampouco com despesas relativas a processos trabalhistas.

CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES DO REPASSE

O Município repassará à Instituição a importância de **R\$ 2.140.403,17** (dois milhões, cent



[Handwritten signature]





Município de Tubarão

e quarenta mil, quatrocentos e três reais e dezessete centavos), ficará retido para o FIA o valor de R\$ 535.100,79 (quinhentos e trinta e cinco mil, cem reais e setenta e nove centavos) do total de R\$ 2.675.503,96 (dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e três reais e noventa e seis centavos) repassados em parcela única no mês de Março de 2023.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos destinados ao presente Termo correrão por conta de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência - FIA,

FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE TUBARÃO

2.027 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Dotação : 1 - 3.3.50 -----2.759.7003.0586 - FIA IMPOSTO DE RENDA - EXERCÍCIO ANTERIOR

CLÁUSULA SEXTA – DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos repassados pelo **MUNICÍPIO** serão aplicados de acordo com o plano de trabalho apresentado pela Instituição, parte integrante deste Termo.


Parágrafo único. Fica vedada a aplicação de recursos nas seguintes situações:

- a) Multas, juros e correção monetária decorrente de pagamento fora do prazo;
- b) Empréstimos não autorizados;
- c) Passagens aéreas e terrestres;
- d) Hospedagem;
- e) Promoções de festas e eventos;
- f) Pagamento de encargos e impostos anteriores à celebração do presente Termo;
- g) Seguro predial e/ou veicular;
- h) Serviço de vigilância eletrônica e/ou presencial;
- i) Aquisição de materiais e/ou peças para utilização em manutenção e/ou reparo de veículos e equipamentos elétricos e/ou eletrônicos;
- j) Manutenção e/ou reparo de veículos ou de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos;
- k) Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres;
- l) Despesas relativas à estabilidade legal decorrente de acidente de trabalho, licença médica prolongada, licença maternidade, tampouco com despesas relativas a processos trabalhistas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS HIPÓTESES DE RETENÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

O **MUNICÍPIO** poderá reter o repasse dos recursos financeiros nas seguintes hipóteses:

- a) Atrasos e irregularidades na prestação de contas;
- b) Aplicação não prevista no plano de trabalho;
- c) Uso injustificável;
- d) Não cumprimento do plano de trabalho;
- e) Falta de clareza, lisura e boa-fé;
- f) Inadimplência com o contrato;
- g) Descumprimento das orientações da Fundação Municipal de Desenvolvimento Social;






Município de Tubarão

h) Não comprovação da divulgação da informação da parceria conforme previsto na cláusula terceira, referente à Instituição item “TV”.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO

Poderá haver rescisão do presente Termo por decisão de qualquer uma das partes, desde que oficializada a intenção com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ou unilateralmente, a qualquer hora, pelo Município, por desvio de finalidade da Entidade. Eventuais alterações ao presente Termo serão realizadas por meio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO

O presente Termo tem início a partir desta data e término em 31 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Tubarão para dirimir questões derivadas deste Termo.

E, por estarem justos e conveniados, firmam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.


Tubarão, SC, 21 de março de 2023.


GELSON JOSÉ BENTO
Prefeito Municipal Interino

ANDRÉ FRETTA MAY

Diretor - Presidente da Fundação Municipal de Desenvolvimento Social

DocuSigned by:


ALLINE JORGETTO CEZARANI

Associação Congregação de Santa Catarina

DocuSigned by:


DENILSON DE SANTA CLARA

Associação Congregação de Santa Catarina

DocuSigned by:


FABIO TADEO TEIXEIRA

A08276BB879343C...

Testemunhas: 1ª Fabio Tadeo Teixeira

2ª Vitória Maria Menezes Guarez
009.950.489-83



Certificado de conclusão

ID de envelope: 801FFD03DDF34B93B1954CDA3C2014EE
 Assunto: Termo de Fomento 001/2023 - Projeto Nas Mãos de Quem Ama - Fase 2
 Envelope de origem:
 Página do documento: 5
 Certificar páginas: 5
 Assinatura guiada: Ativada
 Selo do ID do envelope: Ativada
 Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Estado: Concluído

Autor do envelope:
 SIMONE DE OLIVEIRA MACHADO DA SILVA
 Rua Cincinato Braga, 144 – Bela Vista.
 SP, SP 01333-010.
 simone.msilva@hnsc.org.br
 Endereço IP: 189.22.68.114

Controlo de registos

Estado: Original
 22/03/2023 10:00:13


Titular: SIMONE DE OLIVEIRA MACHADO DA
 SILVA
 simone.msilva@hnsc.org.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Fabio Tadeo Teixeira
 fabio.teixeira@redesc.org.br
 Diretor Executivo

Assinatura

DocuSigned by:

 A08278BB879343C...

Carimbo de data/hora

Enviado: 22/03/2023 10:18:27
 Visualizado: 22/03/2023 13:26:21
 Assinado: 22/03/2023 13:26:34

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Utilizar o endereço IP: 200.225.223.209

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 22/03/2023 13:26:21
 ID: 564e80d6-2981-4913-b0bc-c0cf7997ed08

Daniela Nazare Miranda Alves
 daniela.alves@redesc.org.br

DS


Enviado: 22/03/2023 13:26:38
 Reenviado: 23/03/2023 07:30:04
 Visualizado: 23/03/2023 07:30:07
 Assinado: 23/03/2023 07:31:02

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Utilizar o endereço IP: 187.95.168.84

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 23/03/2023 07:30:07
 ID: 29b5c01f-50f0-4fc3-95a0-cde5b444176c

Guilherme Leandro Machado
 guilherme.machado@redesc.org.br

DS


Enviado: 23/03/2023 07:31:06
 Visualizado: 23/03/2023 07:58:34
 Assinado: 23/03/2023 08:10:46


Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Utilizar o endereço IP: 186.204.59.253

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 23/03/2023 07:58:34
 ID: e1bf056e-c4e7-410e-9f0f-fd9c717ca5fa

Marcelo Fernandes
 marcelo.fernandes@redesc.org.br
 DIRETOR CORP FINANCEIRO
 CORPORATIVO

DS


Enviado: 23/03/2023 08:10:50
 Visualizado: 23/03/2023 11:56:10
 Assinado: 23/03/2023 11:56:30

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
 Utilizar o endereço IP: 177.62.59.194

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:


Eventos do signatário	Assinatura	Carimbo de data/hora
-----------------------	------------	----------------------

Não disponível através do DocuSign

Denilson de Santa Clara
denilson.sclara@redesc.org.br
Dir.Ex.Saúde

DocuSigned by:
Denilson de Santa Clara
EP227853D00145F...

Enviado: 23/03/2023 11:56:35
Visualizado: 23/03/2023 12:20:29
Assinado: 23/03/2023 12:21:08

Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Utilizar o endereço IP: 179.97.178.45

Aviso legal de registos e assinaturas eletrônicos:

Aceite: 21/05/2021 07:11:41
ID: 9cc43b77-feae-4491-aff8-da9f591ed811

Alline Jorgetto Cezarani
alline.cezarani@redesc.org.br
Superintendente
256.313.758-69

DocuSigned by:
Alline Jorgetto Cezarani
A86087B55A134E8...

Enviado: 23/03/2023 12:21:13
Visualizado: 23/03/2023 12:38:23
Assinado: 23/03/2023 12:39:21

Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Utilizar o endereço IP: 191.23.68.66

Aviso legal de registos e assinaturas eletrônicos:

Aceite: 23/03/2023 12:38:23
ID: fe35b6df-55d9-4182-9ae4-17c781390f26

Eventos de signatário presencial	Assinatura	Carimbo de data/hora
----------------------------------	------------	----------------------

Eventos de entrega do editor	Estado	Carimbo de data/hora
------------------------------	--------	----------------------

Eventos de entrega do agente	Estado	Carimbo de data/hora
------------------------------	--------	----------------------

Evento de entrega do intermediário	Estado	Carimbo de data/hora
------------------------------------	--------	----------------------

Eventos de entrega certificada	Estado	Carimbo de data/hora
--------------------------------	--------	----------------------

Eventos de cópia	Estado	Carimbo de data/hora
------------------	--------	----------------------

Eventos relacionados com a testemunha	Assinatura	Carimbo de data/hora
---------------------------------------	------------	----------------------


Eventos de notário	Assinatura	Carimbo de data/hora
--------------------	------------	----------------------

Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptado	22/03/2023 10:18:27
Envelope atualizado	Segurança verificada	22/03/2023 10:46:43
Envelope atualizado	Segurança verificada	22/03/2023 10:46:43
Envelope atualizado	Segurança verificada	22/03/2023 10:46:43
Envelope atualizado	Segurança verificada	22/03/2023 10:46:43
Envelope atualizado	Segurança verificada	22/03/2023 10:46:43
Entrega certificada	Segurança verificada	23/03/2023 12:38:23
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	23/03/2023 12:39:21
Concluído	Segurança verificada	23/03/2023 12:39:21

Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Aviso legal de registos e assinaturas eletrônicos



ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Associacao Congregacao de Santa Catarina. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fabio Tadeo Teixeira', written over a horizontal line.

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Associacao Congregacao de Santa Catarina.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: hugo.oliveira@acsc.org.br

To advise Associacao Congregacao de Santa Catarina. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at hugo.oliveira@acsc.org.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Associacao Congregacao de Santa Catarina.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to hugo.oliveira@acsc.org.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Associacao Congregacao de Santa Catarina.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Oliveira', is located at the bottom right of the page.

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to hugo.oliveira@acsc.org.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Associacao Congregacao de Santa Catarina. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Associacao Congregacao de Santa Catarina. during the course of your relationship with Associacao Congregacao de Santa Catarina..

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hugo Oliveira', written in a cursive style.


6º TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO
HENRIQUE DE ALMEIDA PRADO FRANCESCHI



1º Traslado - Livro 4047 - Páginas: 225/228.

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE
SANTA CATARINA.

Aos VINTE E TRÊS (23) dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS (2.022), nesta Capital, Estado de São Paulo, neste 6º Tabelião de Notas, situado na Avenida Francisco Matarazzo, nº 682, Água Branca, CEP 05001-000, em atendimento ao Provimento nº 100 de 26/05/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a prática de atos notariais eletrônicos utilizando o sistema e-Notariado, perante mim Escrevente Autorizado, compareceu: como Outorgante Mandante ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 283, 2º Andar, Bela Vista, CEP 01310-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.922.168/0001-86, com seu último Estatuto Social datado de 21/01/2021, devidamente registrado no 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo/SP, sob o nº 694.579, em 08/03/2021, (doravante denominada simplesmente como "Outorgante"), neste ato representada na forma do Capítulo IV, Seção III, Artigo 31, de seu Estatuto Social, por sua Vice-Presidente: EUZA MARIA DE ALMEIDA, brasileira, solteira conforme declara, religiosa, nascida em São Francisco de Goiás/GO aos 20/06/1951, portadora da carteira de identidade RG nº 534133-2-DGPC/GO e inscrita no CPF sob o nº 585.258.237-91, com endereço na Avenida Paulista, nº 200, Bela Vista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-000, endereço eletrônico: ir.euza@hotmail.com; e por sua Conselheira sem Designação Específica: GASPARINA DE JESUS VIDAL, brasileira, solteira, religiosa, nascida em Petrolina de Goiás/GO aos 30/08/1950, portadora da cédula de identidade RG nº 196.959-SSP/GO, inscrita no CPF sob o nº 196.697.391-87, com endereço na Avenida dos Andradas, nº 1036, Morro da Glória, Município de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, CEP 36036-120, endereço eletrônico: gasparinajv@hotmail.com; eleitas através da Ata da Assembleia Geral Extraordinária datada de 01/07/2021, registrada no 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo/SP, sob nº 697.925 em 20/08/2021. As presentes, identificadas por mim, à vista dos documentos mencionados e ora exibidos, do que dou fé. E pelas representantes da outorgante, me foi declarado que o ato societário apresentado para a presente procuração é o vigente, não havendo nenhum outro posterior, responsabilizando-se civil e criminalmente por esta declaração. E pela outorgante, na forma como vem representada, me foi dito que, pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui sua bastante



Avenida Francisco Matarazzo 682 Água Branca - São Paulo - SP
Fone: 11-3861-7600



10272602072355.000364607-5

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

HABUO EX TUDO TABELIÃO INCORPORAL, ASSOCIADO ÀS REALIDADES, PASSADO COM INTELIGÊNCIA, IRACUNDA ESTE INCUBIBERTO




6º Tabelião de Notas
de São Paulo - SP
Fundado em 1942

6º TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO
HENRIQUE DE ALMEIDA PRADO FRANCESCHI




praticar todos os atos e assinar todos os documentos condizentes. Enfim, tudo o mais promover para o bom e cabal desempenho do presente mandato. Os elementos relativos à qualificação e identificação da procuradora, bem como os poderes outorgados foram conferidos e confirmados pelas representantes da outorgante, as quais se responsabilizam por sua veracidade, isentando este Tabelião de quaisquer responsabilidades daí decorrentes. PRAZO DE VALIDADE: A presente procuração deverá manter-se **válida até 31/10/2024 (trinta e um de outubro de dois mil e vinte e quatro)** a contar da presente data. Para a lavratura deste ato, foi apresentado o Estatuto Social Vigente, a Ata de Eleição da representante, juntamente com a Certidão de Breve Relato expedida em 22/04/2021 pelo referido 4º RTD, cujas cópias ficam arquivadas nestas Notas na pasta **F-2022, Arquivo 076**. Assim o disseram e outorgaram, do que dou fé. Pediram-me que lavrasse a presente, que lida e estando conforme, aceitam e assinam, perante mim, Escrevente. Traslada em seguida. Eu, **ANDRE LUIZ RODARTE BONFIM**, Escrevente notarial a digitei e lavrei. Eu, **DEMETRIOS LOUIZOS, TABELIÃO SUBSTITUTO**, a subscrevo. (Assinado digitalmente pelo site E-notariado: ELIZA MARIA DE ALMEIDA, GASPARINA DE JESUS VIDAL). (Tabelião: R\$162,60 | Ao Estado: R\$46,22 | Ao Registro Civil: R\$8,56 | A Secretaria da Fazenda: R\$31,63 | A Santa Casa: R\$1,63 | Ao Tribunal de Justiça: R\$11,16 | Ao Ministério Público: R\$7,81 | ISS: R\$3,47 | Total: R\$273,08). **NADA MAIS.** Traslada em seguida. Eu (**DEMETRIOS LOUIZOS**), **TABELIÃO SUBSTITUTO**, a fiz digitar, conferi, subscrevo e assino em público e raso.



Em testemunho da verdade

DEMETRIOS LOUIZOS
TABELIÃO SUBSTITUTO



Selo Digital nº 1246281PR0009296230322222
Selo Digital nº 1246281TR00092960000122C
Consulte no site <https://selodigital.tjsp.jus.br>.



Avenida Francisco Matarazzo 682 Água Branca - São Paulo - SP
Fone: 11-3861-7600



10272602072355.000364606-7

União Internacional
de Notários do Brasil
Fundada em 1974

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 AUTORIDADE NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1974197859

PROIBIDO FALSIFICAR
 1974197859

Nome: **ALLINE JORGETTO CEZARANI**

CPF: 24424167 SSP/SP

CPF: 256.313.758-69 DATA NASCIMENTO: 21/06/1978

Patronímico: OLIVERIO CEZARANI

Nome da Mãe: APARECIDA JORGETTO CEZARANI

PERMISSÃO: R.T.: CAT. NASC.:

CPF REGISTRADO: 03619659103 VALIDADE: 28/01/2025 1ª HABILITAÇÃO: 21/06/2005

"CÓPIA COLÓTYPE"

Assinatura do Portador: *[Assinatura]*

Local: MAUA, SP DATA EMISSÃO: 28/01/2020

Assinatura do Representante: *[Assinatura]*

CPF: 05186950607
 CPF: 04000832824

SÃO PAULO

SERVIÇO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS
 7º SUBDISTRITO ACLIMAÇÃO, 370
 Pires da Mota, 984 - Tel: 3209-9690
AUTENTICAÇÃO
 Documento presente copia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé

S. Paulo 2020 JUL 2020

Esc. *[Assinatura]*
 O Tabelião Notarial do Brasil
 113225
AUTENTICAÇÃO
 AU1071AD0190216

por Autenticação

6º TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO
HENRIQUE DE ALMEIDA PRADO FRANCESCHI



1º Traslado - Livro 4047 - Páginas: 249/252.

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE
SANTA CATARINA.

Aos VINTE E TRÊS (23) dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS (2.022), nesta Capital, Estado de São Paulo, neste 6º Tabelião de Notas, situado na Avenida Francisco Matarazzo, nº 682, Água Branca, CEP 05001-000, em atendimento ao Provimento nº 100 de 26/05/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a prática de atos notariais eletrônicos utilizando o sistema e-Notariado, perante mim Escrevente Autorizado, compareceu: como Outorgante Mandante ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 283, 2º Andar, Bela Vista, CEP 01310-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.922.168/0001-86, com seu último Estatuto Social datado de 21/01/2021, devidamente registrado no 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo/SP, sob o nº 694.579, em 08/03/2021, (doravante denominada simplesmente como "Outorgante"), neste ato representada na forma do Capítulo IV, Seção III, Artigo 31, de seu Estatuto Social, por sua Vice-Presidente: EUZA MARIA DE ALMEIDA, brasileira, solteira conforme declara, religiosa, nascida em São Francisco de Goiás/GO aos 20/06/1951, portadora da carteira de identidade RG nº 534133-2-DGPC/GO e inscrita no CPF sob o nº 585.258.237-91, com endereço na Avenida Paulista, nº 200, Bela Vista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-000, endereço eletrônico: ir.euza@hotmail.com; e por sua Conselheira sem Designação Específica: GASPARINA DE JESUS VIDAL, brasileira, solteira, religiosa, nascida em Petrolina de Goiás/GO aos 30/08/1950, portadora da cédula de identidade RG nº 196.959-SSP/GO, inscrita no CPF sob o nº 196.697.391-87, com endereço na Avenida dos Andradas, nº 1036, Morro da Glória, Município de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, CEP 36036-120, endereço eletrônico: gasparinajv@hotmail.com; eleitas através da Ata da Assembleia Geral Extraordinária datada de 01/07/2021, registrada no 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo/SP, sob nº 697.925 em 20/08/2021. As presentes, identificadas por mim, à vista dos documentos mencionados e ora exibidos, do que dou fé. E pelas representantes da outorgante, me foi declarado que o ato societário apresentado para a presente procuração é o vigente, não havendo nenhum outro posterior, responsabilizando-se civil e criminalmente por esta declaração. E pela outorgante, na forma como vem representada, me foi dito que, pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador DENILSON DE SANTA CLARA, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 4.715.613-0-SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 726.427.859-04, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 283, 2º andar, Bela Vista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP

1º TRASLADO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP
DENILSON DE ALMEIDA
ESCREVENTE AUTORIZADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALER EM TODOS REGRÓRIOS NACIONAIS, EXCETO EM ADOÇÃO, EM CASO DE INSCRIÇÃO, EM CASO DE INSCRIÇÃO, EM CASO DE INSCRIÇÃO




Notário Intermunicipal
do Estado de São Paulo
Instituído em 1949




10272602072355.000364650-4

Avenida Francisco Matarazzo 682 Água Branca - São Paulo - SP
Fone: 11-3861-7600

01310-000, endereço eletrônico: denilson.sclara@redesc.org.br, (doravante simplesmente "Procurador"), a quem são conferidos os poderes necessários para, **em dupla com outro procurador devidamente constituído**, assinar instrumentos contratuais e documentos, todos em nome da matriz e/ou quaisquer filias da outorgante, com pessoas físicas e jurídicas, entidades públicas ou privadas, sempre no melhores interesses das OUTORGANTES e em conformidade com as normas internas das associação; praticar atos em qualquer instituição Financeira, incluindo Bancos e suas Agências; podendo abrir, fechar e movimentar contas bancárias, assinar e endossar cheques; contrato de financiamento; contrato de empréstimo (conforme alçada de aprovação), contrato de câmbio de importação, contratar investimentos, fazer depósitos e retiradas, transferências eletrônicas, exigir saldos e extratos, requerer e retirar talões de cheques, requerer senhas e disponibilização de dispositivos necessários à movimentação de valores mantidos em instituições bancárias (tokens e afins). **Ainda, poderá o procurador representar de forma isolada**, perante quaisquer instituições públicas e/ou privadas, tais como as Juntas Comerciais, Cartório de Notas e Registro de Títulos e Documentos, Banco Central do Brasil, Receita Federal do Brasil, Secretarias Estaduais da Fazenda, Secretarias Municipais de Finanças ou órgãos equivalentes de qualquer Município, agências reguladoras, ministérios e demais órgãos da administração pública Federal, Estadual, Municipal, em quaisquer repartições, departamentos, secretarias, e, ainda, entidades autárquicas, paraestatais e perante os órgãos do poder judiciário, podendo nomear preposto para comparecimento nestes órgãos, bem como para comparecer em audiências de processos judiciais; assinar carteiras de trabalho e demais documentos, assinar perfil profissiográfico previdenciário - PPP, PCMSO, PPRA/PGR, representar a ACSC matriz e/ou filiais perante a Caixa Econômica Federal, Receita Federal do Brasil e demais instituições públicas para dar cumprimento às atividades pertinentes a área de gestão de pessoas e Homologar demissões. Representar perante o Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público dos Estados, sindicatos e demais entidades de classe e firmar acordos coletivos, assinar termos de ajuste de conduta, podendo nomear prepostos para eventuais audiências e reuniões nesses órgãos, **bem como subestabelecer exclusivamente estes poderes**. Por fim, representar a ACSC matriz e/ou filias perante a instituição SERASA SA., autoridade certificadora no âmbito da ICP - Brasil (SERASA AC) e ICP-Brasil, nos atos relativos à solicitação do certificado digital, sendo responsável pelo referido certificado, podendo praticar todos os atos e assinar todos os documentos condizentes. Enfim, tudo o mais promover para o bom e cabal desempenho do presente mandato. Os elementos relativos à qualificação e identificação do procurador, bem como os poderes outorgados foram conferidos e confirmados pelas representantes da outorgante, as quais se responsabilizam por sua veracidade, isentando este Tabelião de quaisquer responsabilidades daí decorrentes. **PRAZO DE VALIDADE:** A presente procuração deverá manter-se **válida até 31/10/2024 (trinta e um de outubro de dois mil e vinte e quatro)** a contar da presente data.



6º TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO
HENRIQUE DE ALMEIDA PRADO FRANCESCHI




Para a lavratura deste ato, foi apresentado o Estatuto Social Vigente, a Ata de Eleição da representante, juntamente com a Certidão de Breve Relato expedida em 22/04/2021 pela referido 4º RTD, cujas cópias ficam arquivadas nestas Notas na pasta **F-2022, Arquivo 076**. Assim o disseram e outorgaram, do que dou fé. Pediram-me que lavrasse a presente, que lida e estando conforme, aceitam e assinam, perante mim, Escrevente. Trasladada em seguida. Eu, ANDRE LUIZ RODARTE BONFIM, Escrevente notarial a digital e lavrei. Eu, **DEMETRIOS LOUIZOS, TABELIÃO SUBSTITUTO**, a subscrevo. (Assinado digitalmente pelo site E-notariado: EUZA MARIA DE ALMEIDA, GASPARIINA DE JESUS VIDAL). (Tabelião: R\$162,60 | Ao Estado: R\$46,22 | Ao Registro Civil: R\$8,56 | A Secretaria da Fazenda: R\$31,63 | A Santa Casa: R\$1,63 | Ao Tribunal de Justiça: R\$11,16 | Ao Ministério Público: R\$7,81 | ISS: R\$3,47 | Total: R\$273,08). NADA MAIS. Trasladada em seguida. Eu (**DEMETRIOS LOUIZOS**), **TABELIÃO SUBSTITUTO**, a fiz digitar, conferi, subscrevo e assino em público e raso.

TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP
DEMETRIOS LOUIZOS
SUBSTITUTO DO TABELIÃO

Em testemunho da verdade

**DEMETRIOS LOUIZOS
TABELIÃO SUBSTITUTO**



Selo Digital nº 1246281PR000930223032222H
Selo Digital nº 1246281TR000930200000122R
Consulte no site: <https://selodigital.tjsp.jus.br>.



10272602072355.000364649-0

Avenida Francisco Matarazzo 682 Agua Branca - São Paulo - SP
Fone: 11-3861-7600

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VELLOS EN TUSO ALPESINO NACIONAL, QUESADEN JUAN PEREZCO, PASADIA ENTE DOCUMENTO



Gravado Eletronicamente
no Sistema de Arquivos
e Informados em
eInformado em 15/04/2021



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: F5AH4-TXZ4P-H7CLW-J3258

Matrícula Notarial Eletrônica: 124628.2022.03.23.00000434-21

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ GASPARINA DE JESUS VIDAL (CPF 196.697.391-87) em 23/03/2022 11:18
- ✓ EUZA MARIA DE ALMEIDA (CPF 585.258.237-91) em 24/03/2022 11:24

Para verificar as assinaturas acesse <https://assinatura.e-notariado.org.br/validade> e informe o código de validação ou siga o link a abaixo:

<https://assinatura.e-notariado.org.br/validade/F5AH4-TXZ4P-H7CLW-J3258>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INTERIORES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

NOME
DENILSON DE SANTA CLARA



DOC. IDENTIDADE / CEG. EMISSOR / UF
4715613 SSP/PR

CPF 726.427.859-04 DATA NASCIMENTO 09/08/1972

FILIAÇÃO
JOAO MARIA DE SANTA CLARA
APARECIDA DE SANTA CLARA

PERMISSÃO ACC. CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO 01909478700 VALIDADE 18/08/2031 1ª HABILITACAO 15/05/1996

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2254022284

REMARKS
A

CÓPIA COLORIDA

SERVIÇO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS
17.º SUBDISTRITO ACLIMACAO
Praça da Moura, 244 - Jd. C. 600-000
AUTENTICAÇÃO DE ORIGINAL E PRESENTE CÓPIA REGISTRADA
original e presente cópia registradas e autenticadas em 15/08/2022
Valor Pago por Autenticação

Denilson de Santa Clara
ASSINATURA DO PORTADOR

113725113
AUTENTICAÇÃO
AU1071AD0251778

LOCAL SÃO PAULO, SP DATA EMISSÃO 20/08/2021

[Signature]
Emissor Autorizado pelo Diretor Presidente do Caram-SP
ASSINATURA DO EMISSOR

08841144156
SP006745159

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR
2254022284



Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
TUBARÃO/SC

RESOLUÇÃO Nº 07/2023/CMDCA

Dispõe sobre a aprovação da readequação do Projeto “Nas Mãos de Quem Ama - Fase 2”.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidos pela Lei 8.069/90 e pela Lei 122/15, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Considerando,

O ofício 29/2023/DIR de 01 de Fevereiro de 2023.

Que cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, formular e controlar as ações da política pública municipal de atendimento à criança e ao adolescente.

A plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA em reunião extraordinária em 01/02/2023.

RESOLVE:


Art. 1º Aprovar a unificação do Projeto “Nas Mãos de Quem Ama – Fase 2” e Projeto Complementar em um único Plano de Trabalho.

Art. 2º Aprovar a liberação do recurso financeiro para a instituição no mês de Fevereiro de 2023 em uma única parcela no valor total de R\$ 2.140.403,17 (dois milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e três reais e dezessete centavos).

Art. 3º Aprovar o saldo residual captado na Fase 2 Complementar do projeto no valor de R\$ 135.143,22 (cento e trinta e cinco mil, cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), seja remanejado para a Fase 3.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Tubarão, 01 de Fevereiro de 2023.



Nazarete S. Oliveira
Presidente do CMDCA



ANEXO V

PLANO DE TRABALHO

*Projeto "Nas mãos de quem ama -
Reforma e Ampliação da UTI Mista
(Neonatal e Pediátrica)
Fase 2*

**Hospital Nossa Senhora da Conceição
Tubarão – SC
2023**



**HOSPITAL NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO**
REDE SANTA CATARINA

Rua Vidal Ramos, 215
Centro
Tubarão - SC
CEP 88701-160
Tel: (48) 3631-7000

1	IDENTIFICAÇÃO
NOME do responsável pela OSC	Fabio Tadeo Teixeira
Área de ATUAÇÃO	Saúde

2	INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE
Nome: Associação Congregação de Santa Catarina - Hospital Nossa Senhora da Conceição.	
CNPJ nº: 60.922.168/0053-07	
Registro no CMDCA nº:	Validade do Registro:
Endereço: Rua Vidal Ramos	Nº: 215 Complemento: Hospital
Bairro: Centro	Cidade: Tubarão
Estado: SC	CEP: 88701-160
Telefone: (48) 3631-7000	Cel
	Fax: (48) 3631-7088
E-mail: hnsc@redesc.org.br	
CNES: 2491710	
Nome coordenador técnico (Responsável pelo Projeto): Soraia Bittencourt da Rosa Martins	
Telefone: (48) 3631-7085 (48) 99626-8703	Fax: (48) 3631-7088
	E-mail: soraia.martins@redesc.org.br
Assinatura do coordenador responsável:	DocuSigned by: SORAIA BITTENCOURT DA ROSA MARTINS 2851625F0AF443D...

3	RESUMO DAS INFORMAÇÕES
A	Local/Endereço e Região de Atuação do Projeto: Hospital Nossa Senhora da Conceição – Rua Vidal Ramos, 215 – Tubarão – SC
B	Objetivo Geral: Garantir um ambiente seguro e acolhedor para recém-nascidos, crianças e adolescentes de Tubarão e região, hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva Mista (Neonatal e Pediátrica) do Hospital Nossa Senhora da Conceição.
C	Sumário do projeto: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificação do projeto e responsáveis <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Projeto 1.2. Responsáveis 1.3. Finalidades Estatutárias 1.4. Área de abrangência 1.5. Objetivos 1.6. Ação e resultado 1.7. Justificativa 1.8. Público alvo

DS
FTT



<p>1.9. Meta de atendimento</p> <p>1.10. Metodologia</p> <p>2. Recursos a serem utilizados</p> <p>2.1. Recursos materiais e financeiros</p> <p>2.2. Recursos Humanos</p> <p>3. Plano de ação</p> <p>4. Avaliação</p>		
<p>D Nº de beneficiários (direto) atendidos:</p>		
<p>Público beneficiado pelo projeto¹</p> <p>¹A separação de recém-nascidos e crianças foi feita em função dos diferentes tipos de atendimento e especificidades de tratamento do público alvo do projeto, conforme determina o Ministério da Saúde.</p>	<p>Número de beneficiados diretos²</p> <p>²O cálculo de beneficiados diretos do projeto baseia-se na média/ano da capacidade instalada da unidade considerando 80% de ocupação dos leitos.</p>	<p>Indiretos³</p> <p>³O cálculo de crianças beneficiadas indiretamente refere-se a população total de 0 a 14 anos, das 45 cidades que tem o HNSC como referência para o atendimento em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica.</p>
<p>Recém-nascidos (0 a 28 dias)</p>	<p>4.380 recém-nascidos/dia ano – considerando 80% de ocupação dos leitos</p>	<p>191.014 (Crianças de até 14 anos)</p>
<p>Crianças e Adolescentes⁴ (29 dias a 13 anos, 11 meses e 29 dias)</p> <p>⁴Adolescente com mais de 14 anos são enviados para tratamento na Unidade de Terapia Intensiva Adulto</p>	<p>1.460 crianças e adolescentes/dia ano – considerando 80% de ocupação dos leitos</p>	
<p>Jovens</p>	<p>Não se aplica</p>	<p>Não se aplica</p>
<p>Famílias com crianças/adolescentes⁵</p> <p>⁵O cálculo de famílias com crianças beneficiadas diretamente pelo projeto baseia-se na média/ano de internações da unidade.</p>	<p>Mínimo de 379 famílias/ano</p>	
<p>E Custo total do projeto: R\$ 2.675.503,96 (Dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e três reais e noventa e seis centavos)</p>		
<p>F Duração das atividades ou do projeto (nº meses): 8 (oito) meses</p>		

DS
FTT



Rua Vidal Ramos, 215
Centro
Tubarão - SC
CEP 88270-700
Tel (48) 3631-7000

G	Custo per capita/mês R\$* Custo paciente/dia (1 leito): R\$ 1.271,07 Custo paciente/mês (1 leito): R\$ 38.138,10 Custo mensal unidade: R\$ 387.853,78 *custo relacionado à manutenção da unidade
H	Valor total de manutenção/ano da Entidade/Projeto R\$ 4.654.245,32

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E RESPONSÁVEIS

1.1 Projeto

Nome completo do Projeto:

Nas mãos de quem ama - Reforma e Ampliação da UTI Mista (Neonatal e Pediátrica) – Fase 2

Endereço/Telefone/e-mail: Rua Vidal Ramos, 215 – Tubarão/SC - (48) 3631-7000

Data do início: a partir do repasse de recursos conforme cronograma de desembolso

Término do Projeto: 8 (oito) meses após o início do repasse dos recursos

1.2 Responsáveis

Nome do (a) coordenador (a) do Projeto (técnico responsável):

Izaque Antunes Dacorégio – Técnico Responsável

Assinatura do (a) coordenador (a) do projeto ou do responsável pela Organização

Beneficiária:

Fábio Tadeo Teixeira – Diretor Executivo (Procurador da Entidade)

DocuSigned by:
Fábio Tadeo Teixeira
A6827688379343C...

1.3 Finalidades Estatutárias (resumido)

1. Prestar assistência à saúde
2. Promover e dirigir a educação e a instrução
3. Exercer o serviço social, executando a política de assistência social
4. Prestar serviços de assistência à infância
5. Prestar serviços de assistência à terceira idade
6. Promover eventos sociais, culturais, pastorais e religiosos

DS
FTT

População da Região AMUREL (estimativa 2021): 18 municípios | 374.693 habitantes.

NOME DO MUNICÍPIO	POPULAÇÃO ESTIMADA
Armazém	8.843
Braço do Norte	34.294
Capivari de Baixo	25.477
Grão Pará	6.621
Gravatal	11.652
Imaruí	9.764
Imbituba	45.711
Jaguaruna	20.547
Laguna	46.424
Pedras Grandes	3.931
Pescaria Brava	10.225
Rio Fortuna	4.630
Sangão	13.128
Santa Rosa de Lima	2.151
São Ludgero	13.886
São Martinho	3.162
Treze de Maio	7.104
Tubarão	107.143
TOTAL POPULAÇÃO AMUREL	374.693

Tabela 1 POPULAÇÃO AMUREL

Fonte: IBGE (estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2020)

População da Região AMREC (estimativa 2021): 12 municípios / 446.902 habitantes.

NOME DO MUNICÍPIO	POPULAÇÃO ESTIMADA
Cocal do Sul	16.956
Criciúma	219.393
Forquilha	27.621
Içara	58.055
Lauro Müller	15.380
Morro da Fumaça	18.095
Nova Veneza	15.515
Orleans	23.161
Siderópolis	14.176
Treviso	4.002
Urussanga	21.419
Balneário Rincão	13.129
TOTAL POPULAÇÃO AMREC	446.902

Tabela 2 POPULAÇÃO AMREC

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. (Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2021)

População da Região AMESC (estimativa 2021): 15 municípios / 206.347 habitantes.

NOME DO MUNICÍPIO	POPULAÇÃO ESTIMADA
Araranguá	68.867
Balneário Arroio do Silva	13.430
Balneário Gaivota	11.260
Ermo	2.061
Jacinto Machado	10.376
Maracajá	7.378
Meleiro	7.001
Morro Grande	2.888
Passo de Torres	9.048
Praia Grande	7.312
Santa Rosa do Sul	8.378
São João do Sul	7.315
Sombrio	30.733
Timbé do Sul	5.343
Turvo	12.990
TOTAL POPULAÇÃO AMESC	206.347

Tabela 3 POPULAÇÃO AMESC

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. (Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2021)

1.5 Objetivos (geral e específicos)

OBJETIVO GERAL

Garantir um ambiente seguro e acolhedor para recém-nascidos, crianças e adolescentes de Tubarão e região, hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva Mista (Neonatal e Pediátrica) do Hospital Nossa Senhora da Conceição.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Específico 1: Reformar e ampliar o espaço destinado aos leitos da UTI Pediátrica.

Objetivo Específico 2: Reformar e adequar as áreas de apoio necessárias ao funcionamento da unidade de acordo com a legislação vigente.



Rua Vol Rames, 215
Cânio
Itaberá - SC
CEP: 88111-000
Tel: (48) 3631-7000

Objetivo Específico 3: Assegurar um espaço seguro e favorável ao desenvolvimento das práticas assistenciais de cuidado humanizado e à permanência da família no ambiente.

DS
PTT

Ação e resultado (Definir em termos qualitativos e quantitativos o que se pretende alcançar como resultado para cada objetivo específico)

Objetivos Específicos	Ação/atividade	Meta	Resultado esperado	Forma de acompanhamento	
Objetivo geral Garantir um ambiente seguro e acolhedor para recém-nascidos, crianças e adolescentes de Tubarão e região, hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva Mista (Neonatal e Pediátrica) do Hospital Nossa Senhora da Conceição.	Obj. Esp. 1 Reformar e ampliar o espaço destinado aos leitos da UTI Pediátrica.	5 leitos pediátricos disponíveis para utilização de crianças de até 13 anos, 11 meses e 29 dias	Ampliação do número de leitos da UTI para pacientes pediátricos.	Cronograma de obra Registro fotográfico	
	Obj. Esp. 2 Reformar e adequar as áreas de apoio necessárias ao funcionamento da unidade de acordo com a legislação vigente.	Reforma das seguintes áreas: sala de espera, depósito de equipamentos, banheiro de acompanhantes, sala de coordenação e sala de atendimento	Reforma de 100% das áreas de apoio previstas na Fase 2	Estrutura e apoio adequados para o funcionamento do serviço da UTI	Cronograma de obra Registro fotográfico
	Obj. Esp. 3 Assegurar um espaço favorável ao desenvolvimento das práticas assistenciais de cuidado humanizado e à permanência da família no ambiente.	Adequação do espaço visando a segurança do paciente e à permanência da família junto à criança	100% dos espaços reformados com os sistemas de segurança devidamente instalados e espaço nos leitos pediátricos para a permanência de 1 pai/mãe ou responsável	Proporcionar à família um espaço adequado onde ela possa permanecer com a criança durante o tratamento	Cronograma de obra Registro fotográfico

ds
FTM

Resumo do Projeto

O projeto propõe a execução da segunda fase da reforma da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica do Hospital Nossa Senhora da Conceição, localizado no município de Tubarão. Nesta fase o objetivo é avançar na reforma e adequações das áreas de apoio e concluir a reforma e ampliação do salão destinado aos pacientes pediátricos, que passará a ter estrutura para 5 leitos.

O padrão construtivo da obra irá obedecer às orientações da RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, e as especificidades e atribuições assistenciais necessárias para o funcionamento de 15 leitos de UTI neonatal e 5 leitos de UTI pediátrica, que serão entregues ao final de todas as fases do projeto.

1.6 Justificativa / Definição da Ação

Segundo a última atualização do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), em 2020 nasceram 12.990 crianças em Tubarão e nos 44 municípios que têm o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) como referência para o tratamento em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica. Ainda segundo o Datasus, em 2021, o HNSC realizou 2.135 partos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de pacientes oriundos de 45 municípios. Deste montante, 976 partos foram de alto risco, ou seja, quase metade dos bebês nascidos, potencialmente necessitaram de cuidados na UTI Neonatal.

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal Brasileira e reforçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que dedica o Artigo 7 para tratar deste tema. Para além da legislação brasileira, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável preconizados pela ONU também apontam, no Objetivo 3, o foco na saúde e apresenta como uma das metas o fim das mortes evitáveis de bebês e crianças.

O Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) é referência para a gestação de alto risco e para o tratamento intensivo de crianças e prima pela qualidade e segurança do paciente, fazendo isso pautado no conceito de cuidado integral e humanizado visando minimizar os impactos causados pela hospitalização. Entretanto, a crescente demanda de pacientes na UTI Neonatal e Pediátrica tornou a unidade desatualizada quanto a estrutura física, referente aos aspectos normativos, principalmente no que se refere à norma RDC nº 50 da Anvisa, que regula o espaço físico de estabelecimentos de assistência à saúde e a RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 2010, que estabelece padrões mínimos para funcionamento de unidades de terapia intensiva.



Contudo, em função da complexidade do serviço oferecido pela UTI, torna-se necessário fasear o projeto em 4 fases para garantir que o atendimento não seja interrompido e assegurar, sobretudo, a qualidade e segurança dos neonatos, crianças e adolescente durante o tratamento.

Atualmente a UTI tem capacidade instalada para atender 12 pacientes. Com a conclusão total do projeto este número será ampliado para 20 leitos. Na Fase 2, de que trata este projeto, está prevista a reforma e adequação das áreas de apoio, que são fundamentais para o funcionamento da unidade, além da reforma e ampliação para 5 leitos destinados a pacientes em tratamento na UTI Pediátrica.

Além de garantir a adequação da planta da unidade às legislações vigentes e a ampliação da capacidade de atendimento, o projeto permitirá que a família, em especial os pais permaneçam ao lado do recém-nascido e da criança em tempo integral durante o período de internação, outro direito preconizado no Artigo 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

A UTI Mista do HNSC está à disposição das Secretarias de Saúde Municipais e Estadual, através da Regulação Estadual, conforme pactuação vigente, para a utilização de pacientes oriundos da cidade de Tubarão e dos 44 municípios da região, que juntos somam mais de 1 milhão de habitantes, proporcionando um atendimento humanizado, com qualidade, rapidez diagnóstica e redução do tempo de resposta ao tratamento.

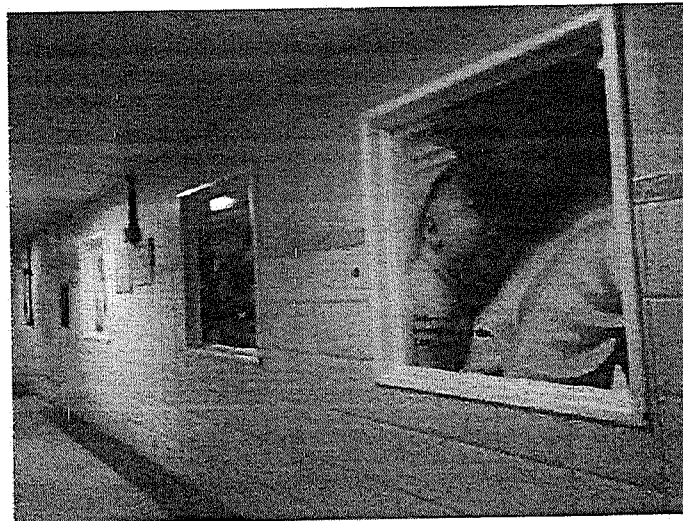


FOTO 1 - UTI Neonatal e Pediátrica – Hospital Nossa Senhora da Conceição – Tubarão SC/2022

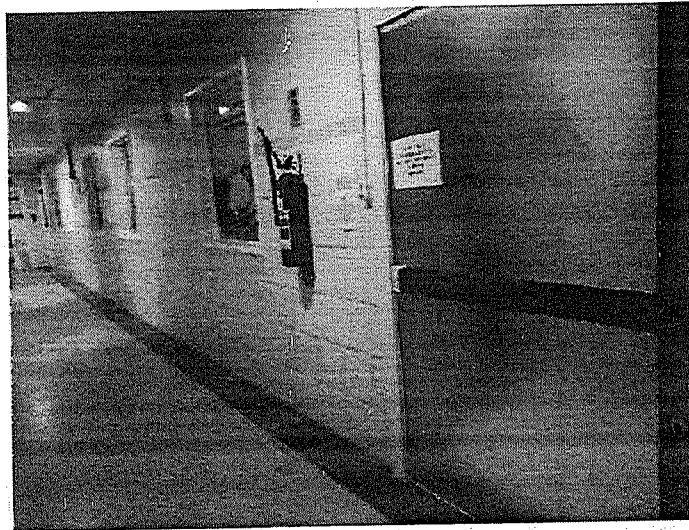


FOTO 2 - UTI Neonatal e Pediátrica – Hospital Nossa Senhora da Conceição – Tubarão/SC/2022

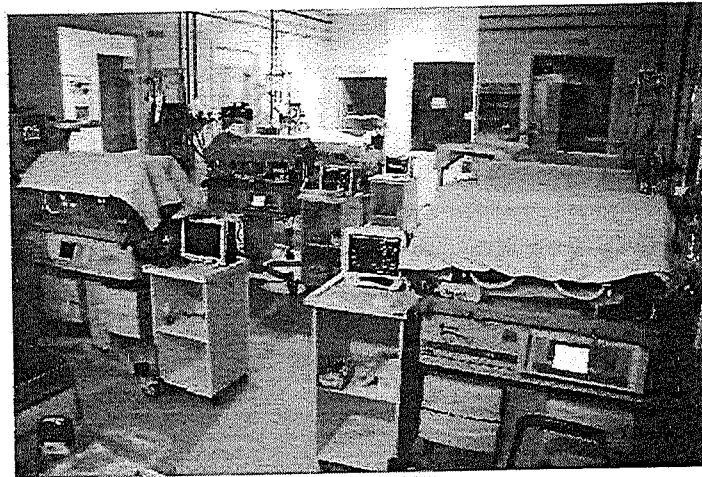


FOTO 3 - UTI Neonatal e Pediátrica – Hospital Nossa Senhora da Conceição – Tubarão/SC/2022

REFERÊNCIAS

CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Artigo 7. "A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência."

Artigo 12. "Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente". (Artigo 12 - dada pela Lei nº 13.257, de 2016).

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Meta 3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos

PORTARIA Nº 930, DE 10 DE MAIO DE 2012

Define as diretrizes e objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 7º O número de leitos de Unidades Neonatal atenderá ao seguinte parâmetro de necessidade populacional: para cada 1000 (mil) nascidos vivos poderão ser contratados 2 (dois) leitos de UTIN, 2 (dois) leitos de UCINCo e 1 (um) leito de UCINCa.



1.7 Público Alvo

Diretos: recém-nascidos (de zero a 28 dias de vida) e crianças e adolescentes (de 29 dias de vida a 13 anos, 11 meses e 29 dias) do município de Tubarão e região que necessitem de cuidados de terapia intensiva.

Indiretos: família das crianças, população de 0 a 13 anos, 11 meses e 29 dias, de Tubarão e região.

1.8 Meta de Atendimento


<i>Metas – Objetivo Específico 1</i>	<i>Produto</i>	<i>Abrangência</i>	<i>Resultado esperado</i>
5 leitos pediátricos disponíveis para utilização de crianças de até 13 anos, 11 meses e 29 dias	5 leitos de terapia intensiva	Crianças de até 13 anos, 11 meses e 29 dias de Tubarão e região	Ampliação do número de leitos da UTI para pacientes pediátricos
<i>Metas – Objetivo Específico 2</i>	<i>Produto</i>	<i>Abrangência</i>	<i>Resultado esperado</i>
Reforma de 100% das áreas de apoio previstas na Fase 2	Sala de espera, depósito de equipamentos, banheiro de acompanhantes, sala de coordenação e sala de atendimento	Crianças internadas na UTI, familiares das crianças e funcionários da unidade	Estrutura e apoio adequados para o funcionamento da UTI
<i>Meta – Objetivo Específico 3</i>	<i>Produto</i>	<i>Abrangência</i>	<i>Resultado esperado</i>
100% dos espaços reformados com os sistemas de segurança devidamente instalados e espaço no leito para a permanência de 1 pai/mãe ou responsável	Espaços reformados e leitos pediátricos adequados para a permanência de 1 acompanhante em período integral	Crianças internadas na UTI e familiares das crianças	Proporcionar à família um espaço adequado onde ela possa permanecer com a criança durante o tratamento.

1.9 Metodologia

A metodologia do projeto está detalhada do ponto de vista de Engenharia e Arquitetura, tendo como base as etapas de execução previstas no cronograma da obra.

O projeto arquitetônico completo de reforma e ampliação da UTI Mista está previsto para ocorrer em 4 fases, conforme indica a planta abaixo, para que não ocorram interferências ou interrupções no atendimento regular da Unidade.

Contudo, este projeto trata apenas da **Fase 2** – indicada pela **letra B** na figura.

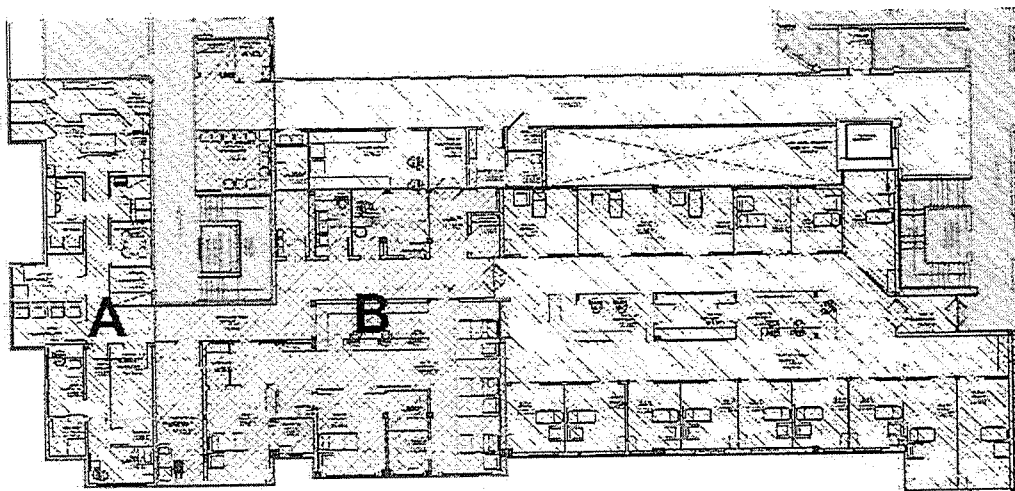

PLANTA BAIXA PROPOSTA

Figura 3 PLANTA BAIXA - UTI NEONATAL E PEDIÁTRICA – Salão UTI Pediátrica e área de apoio.

Na **Fase 2** do projeto, prevista para ocorrer em 8 (oito) meses, está contemplada a reforma das seguintes áreas: sala de espera, depósito de equipamentos, salão da UTI pediátrica (5 leitos), banheiro de acompanhantes, sala de coordenação e sala de atendimento. A intervenção nesta área totaliza 272,22 m². O projeto de Arquitetura e Engenharia da obra desenvolvido atende todas as exigências legais para a reforma e funcionamento da Unidade de Terapia Intensiva Mista - Neonatal e Pediátrica.

Desde a sua aprovação em 2020, o Projeto “Nas Mãos de Quem Ama - Fase 2”, o HNSC conseguiu captar um valor expressivo de recursos incentivados, ultrapassando o valor aprovado do projeto original. Porém, com a recente atualização dos orçamentos (**ANEXO I**), decorrente do aumento de preço das matérias primas utilizadas pelo setor e também da mão-de-obra especializada, constatou-se um impacto muito grande no valor atual da obra.

Apesar disso, o HNSC não mediu esforços e empenho para captar o montante de recursos necessários para a execução desta fase do projeto, conseguindo superar até o dia 31 de dezembro de 2022, o valor necessário para a execução completa da Fase 2.

A empresa Engenharia Castanheira Ltda. apresentou a proposta de menor preço e será contratada pelo HNSC para a execução da Fase 2. Todos os custos estão contidos dentro do orçamento apresentado pela empresa, incluindo mão-de-obra e materiais, por exemplo. No entanto, para reduzir o custo orçamentário da obra, a contratação não será efetivada com pagamento global à empresa.

Desta forma, informamos que haverá faturamento direto ao HNSC das empresas de materiais e de locação de equipamentos, de forma que apresentaremos na ocasião da prestação de contas tanto documentos que comprovem pagamento para a Engenharia Castanheira Ltda., quanto para as demais empresas fornecedoras dos materiais/ locação de equipamentos para a obra.

Para a execução da Fase 2 será necessário realocar alguns setores e transferir o atendimento da Unidade para a área reformada na Fase 1, que foi executada em 2022. Na Fase 2 está prevista a conclusão da reforma e ampliação do salão para a instalação dos leitos intensivos pediátricos, porém em função do faseamento da obra, este só será utilizado para esta finalidade com a conclusão das fases seguintes.

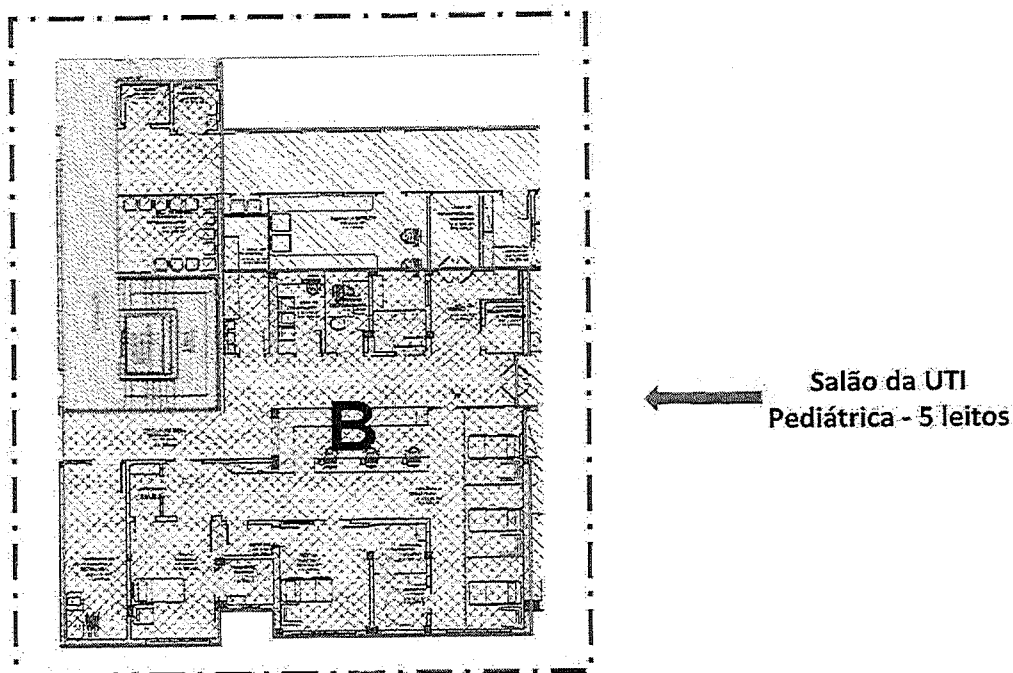


Figura 4 PLANTA BAIXA - UTI NEONATAL E PEDIÁTRICA – Salão UTI Pediátrica e área de apoio

Os equipamentos necessários ao funcionamento da Unidade serão adquiridos no decorrer e após a reforma por meio de recursos próprios, editais de órgão públicos, emendas parlamentares e demais oportunidades avaliadas pelo Hospital.

A reforma desta fase está prevista para acontecer em até 8 (oito) meses conforme cronograma abaixo:

DS
PIT



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO								
Descrição Resumida das Ações	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês
	1	2	3	4	5	6	7	8
01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	x	x	x	x	x	x		
02. SERVIÇOS PRELIMINARES	x	x						
03. DEMOLIÇÕES	x	x						
04. ALVENARIA/DIVISÓRIAS/REVESTIMENTOS		x	x	x	x			
05. PISO				x	x			
06. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			x	x				
07. IMPERMEABILIZAÇÃO				x	x			
08. ESQUADRIAS		x	x	x	x	x		
09. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PPCI		x	x	x	x	x		
10. CLIMATIZAÇÃO	x	x	x	x	x			
11. GASES MEDICINAIS			x	x	x	x		
12. FORRO E ACESSÓRIOS				x	x			
13. PINTURA					x	x		
14. LIMPEZA DA OBRA						x		
15. PRESTAÇÃO DE CONTAS							x	x

*O cronograma pode sofrer alterações de acordo com o andamento da obra.

Habilitação dos Leitos

Importante ressaltar que só após a conclusão de todas as fases da reforma será possível habilitar os leitos da UTI Neonatal e Pediátrica (leitos ampliados) para a utilização. A habilitação de leitos é um processo que exige aprovação do gestor municipal de saúde, Conselho Municipal de Saúde (CMS), Comissão Intergestores Regionais (CIR), Comissão Intergestores Bipartite (CIB), Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES), mediante vistoria prévia da Unidade e Ministério da Saúde (MS). Os leitos já habilitados continuarão a ser utilizados normalmente, durante e após a reforma da Unidade

Atividades desenvolvidas

	Passeios		Alimentação banco de dados		Oficina
	Reunião de equipe	x	Serviços administrativos /burocráticos		Brinquedoteca
	Avaliação	x	Acompanhamento Nutricional		Prática esportiva
	Relatório Final	x	Atividades lúdicas e recreativas		
	Capacitação		Triagem/ inclusão/ cadastramento		Acompanhamento escolar
	Palestra		Eventos comemorativos		Confraternizações
	Visita domiciliar		Atendimento social individual	x	Atendimento social grupal
x	Atividade com Famílias		Orientação/ Encaminhamentos a recursos da comunidade	x	Outras (citar) Assistência integral à saúde Apoio psicológico familiar



2. RECURSOS A SEREM UTILIZADOS (Materiais/humanos/financeiros)

2.1 Recursos materiais e financeiros – descrição das despesas

Natureza da despesa	Objeto/ Descrição	Orçamento 1	Orçamento 2	Orçamento 3	TOTAL
Serviços de terceiros	Administração local, serviços preliminares, demolições e remoções, alvenarias / divisórias / revestimentos, piso, instalações hidráulicas, impermeabilização, esquadrias, instalações elétricas e PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios), climatização, gases medicinais, forro e acessórios, pintura, limpeza da obra e omissos	R\$ 2.893.153,84	R\$ 2.857.522,47	R\$ 2.140.403,17	R\$ 2.140.403,17
SUB-TOTAL PROJETO ARQUITETÔNICO					R\$ 2.140.403,17
20% FIA					R\$ 535.100,79
VALOR TOTAL DO PROJETO					R\$ 2.675.503,96

Planilha Orçamentária

PLANILHA DE ORÇAMENTOS				
Item	Objeto/Descrição	Orçamento 1 Belle Eng	Orçamento 2 Rio Campense	Orçamento 3 Castanhel
1.	RECURSOS PROJETO ARQUITETÔNICO			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	51.450,00	176.017,23	170.805,46
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	58.062,50	65.079,07	63.518,03
1.3	DEMOLIÇÕES	196.352,50	154.828,79	270.948,65
1.4	ALVENARIA/DIVISÓRIAS/REVESTIMENTOS	192.335,00	182.839,26	101.029,52
1.5	PISO	166.890,00	283.251,05	189.898,82
1.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	92.625,00	181.392,00	114.826,92
1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO	74.560,00	69.711,16	17.603,30
1.8	ESQUADRIAS	131.223,00	157.880,55	118.509,36
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PPCI	329.522,00	490.720,63	226.373,96
1.10	CLIMATIZAÇÃO	963.650,00	284.061,48	579.776,04
1.11	GASES MEDICINAIS	139.680,00	516.507,74	114.098,99
1.12	FORRO E ACESSÓRIOS	75.785,00	99.049,63	79.410,14
1.13	PINTURA	142.120,00	174.212,50	90.384,12
1.14	LIMPEZA DA OBRA	44.962,50	8.343,85	3.219,86
1.15	OMISSOS	233.936,34	13.627,50	0,00
VALOR TOTAL DA OBRA		2.893.153,84	2.857.522,44	2.140.403,17
RETENÇÃO DE 20% PARA O FIA		723.288,46	714.380,61	535.100,79
VALOR TOTAL DO PROJETO		3.616.442,30	3.571.903,05	2.675.503,96

DS
FTT



Cronograma de desembolso do recurso financeiro

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO / DESEMBOLSO								
SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
OBRA	2.140.403,17							
TOTAL ACUMULADO	2.140.403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$ 2.140.403,17								

Obs.: O desembolso para as empresas será realizado após a medição (quinzenal) e mediante apresentação das notas fiscais de serviço e/ou materiais e/ou locação de equipamentos.

2.2 Recursos Humanos

Quantidade	Cargo/função	Formação	Carga Horária (semanal)	Fonte de Financiamento
48	Técnicos de Enfermagem	Curso Técnico de Enfermagem	42 horas	Recurso Próprio
1	Coordenador de UTI	Graduação em Enfermagem	44 horas	Recurso Próprio
16	Enfermeiros	Graduação em Enfermagem	42 horas	Recurso Próprio
6	Fisioterapeutas	Graduação em Fisioterapia	44 horas (com sobreaviso finais de semana e período noturno)	Recurso Próprio
2	Psicólogos	Graduação em Psicologia	44 horas	Recurso Próprio
	Médico Neonatologista	Pediatria com especialidade em Neonatologia	Conforme escala de trabalho pré-estabelecida	Recurso Próprio
	Médico Intensivista Pediátrico	Pediatria com especialidade em Unidade Intensiva	Conforme escala de trabalho pré-estabelecida	Recurso Próprio
	Médico Plantonista Pediátrico	Pediatria	Conforme escala de trabalho pré-estabelecida	Recurso Próprio
1	Assistente Social	Graduação em Assistência Social	30 horas	Recurso Próprio
2	Fonoaudióloga	Graduação em Fonoaudiologia	44 horas	Recurso Próprio
1	Nutricionista	Graduação em Nutrição	44 horas	Recurso Próprio

DS
FTT

3. PLANO DE AÇÃO (detalhe as atividades por objetivo específico)

Objetivos específicos	Atividades	Forma de acompanhamento	Responsável por atividade
Obj. Esp. 1 Reformar e ampliar o espaço destinado aos leitos da UTI Pediátrica.	Reforma e ampliação do salão destinado à 5 leitos de UTI Pediátrica	Cronograma de obra Registro fotográfico	Engenharia
Obj. Esp. 2 Reformar e adequar as áreas de apoio necessárias ao funcionamento da unidade de acordo com a legislação vigente.	Reforma das seguintes áreas: sala de espera, depósito de equipamentos, banheiro de acompanhantes, sala de coordenação e sala de atendimento	Cronograma de obra Registro fotográfico	Engenharia
Obj. Esp. 3 Assegurar um espaço favorável ao desenvolvimento das práticas assistenciais de cuidado humanizado e à permanência da família no ambiente.	Adequação do espaço visando a segurança do paciente e à permanência da família junto à criança	Cronograma de obra Registro fotográfico	Engenharia

4. AVALIAÇÃO

A avaliação do projeto será feita após a conclusão da segunda fase, conforme descrito no cronograma. As atividades desenvolvidas serão avaliadas pelos gestores das áreas impactadas tendo como base as metas a serem alcançadas e a qualidade do serviço realizado.

Objetivo Específico	Indicadores	Método de Verificação	Avaliador
Obj. Esp. 1 Reformar e ampliar o espaço destinado aos leitos da UTI Pediátrica.	- Nº de leitos	Relatório de acompanhamento da obra Fotos	
Obj. Esp. 2 Reformar e adequar as áreas de apoio necessárias ao funcionamento da unidade de acordo com a legislação vigente.	- Taxa de cumprimento dos prazos da obra	Relatório de acompanhamento da obra Fotos	
Obj. Esp. 3 Assegurar um espaço favorável ao desenvolvimento das práticas assistenciais de cuidado humanizado e à permanência da família no ambiente.	- Taxa de cumprimento dos prazos da obra	Relatório de acompanhamento da obra Fotos	

 DS
 PTT



**HOSPITAL NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO**
REDE SANTA CATARINA

Rua V. Cat. Ramos, 215
Centro
Tubarão - SC
CEP: 82700-180
Tel: (48) 3621-7000

Tubarão, 01 de fevereiro de 2023.

DocuSigned by:

Fabio Tadeu Teixeira

A062785B879543C...

Fabio Tadeu Teixeira

Diretor Executivo


ACSC – Hospital Nossa Senhora da Conceição.



ANEXO I

ORÇAMENTOS DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO


Empresa: Belle Engenharia
 Hospital Nossa Senhora da Conceição
 OBRA: Reforma e Ampliação Uti Neonatal - Etapa 02
 LOCALIZAÇÃO: Tubarão/SC



Descrição	Qtd.	Und.	Mão-de-obra		Materiais e Equipamentos		Preço total	
			Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL				42.500,00		8.950,00	15.450,00	51.450,00
Administração Local da Obra	5,00	mes	7.000,00	35.000,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00	40.000,00
Higiene e Segurança do Trabalho	5,00	mes	400,00	2.000,00	600,00	3.000,00	1.000,00	5.000,00
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	1,00	vb	500,00	5.000,00	350,00	350,00	5.350,00	5.350,00
Serviço de Proteção	1,00	vb	500,00	500,00	600,00	600,00	1.100,00	1.100,00
02. SERVIÇOS PRELIMINARES				16.862,50		41.200,00	14.595,00	58.062,50
Área de Vivência	1,00	vb	1.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
Escada Metálica	5,00	mes	500,00	2.500,00	1.000,00	5.000,00	1.500,00	7.500,00
Instalações Provisórias de Água e Esgoto	1,00	vb	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00
Instalações Provisórias de Energia	1,00	vb	3.000,00	3.000,00	750,00	750,00	3.750,00	3.750,00
Tapume com Telha Metálica H=2,20m	50,00	m	70,00	3.500,00	310,00	15.500,00	380,00	19.000,00
Tapume de Chapa de Madeira	52,50	m2	45,00	2.362,50	300,00	15.750,00	345,00	18.112,50
Placa de Obra	10,00	m2	100,00	1.000,00	20,00	200,00	120,00	1.200,00
03. DEMOLIÇÕES				163.067,50		33.285,00	12.243,00	196.352,50
Demolição de Alvenaria	271,00	m2	100,00	27.100,00	10,00	2.710,00	110,00	29.810,00
Remoção de Piso	258,00	m2	130,00	33.540,00	10,00	2.580,00	140,00	36.120,00
Remoção de Rodapé	131,00	m	30,00	3.930,00	5,00	655,00	35,00	4.585,00
Demolição Azulejos	199,50	m2	150,00	29.925,00	5,00	997,50	155,00	30.922,50
Demolição de Concreto	28,50	m3	90,00	2.565,00	10,00	285,00	100,00	2.850,00
Furos para Passagem de Tubulação	6,00	un	200,00	1.200,00	10,00	60,00	210,00	1.260,00
Rasgo em Alvenaria	600,00	m	20,00	12.000,00	3,00	1.800,00	23,00	13.800,00
Remoção de Rede Hidráulica	1,00	vb	5.000,00	5.000,00	1000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
Remoção de Porta	15,00	un	150,00	2.250,00	20,00	300,00	170,00	2.550,00
Remoção de Janela	16,00	un	200,00	3.200,00	20,00	320,00	220,00	3.520,00
Remoção de Forro	243,50	m2	55,00	13.392,50	5,00	1.217,50	66,00	14.610,00
Remoção de Instalações Elétricas/Gases Medicinais	1,00	vb	3000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00
Transporte Horizontal de Entulho	105,00	m3	90,00	9.450,00	20,00	2.100,00	110,00	11.550,00
Duto de Entulho	60,00	dia	60,00	3.600,00	50,00	3.000,00	110,00	6.600,00
Remoção de Entulho Classe A	166,00	m3	70,00	11.620,00	80,00	13.280,00	150,00	24.900,00
Remoção de Entulho Classe B	18,50	m3	70,00	1.295,00	80,00	1.480,00	150,00	2.775,00
04. ALVENARIA/DIVISÓRIAS/REVESTIMENTOS				73.440,00		119.895,00	2.502,00	192.335,00
Parede de Tijolos Esp. 15cm	142,00	m2	200,00	28.400,00	100,00	14.200,00	300,00	42.600,00
Vergas e Contravergas	46,00	m	150,00	6.900,00	250,00	11.500,00	400,00	18.400,00
Reboco Interno	284,00	m2	60,00	17.040,00	150,00	42.600,00	210,00	59.640,00
Reboco Externo	20,00	m2	80,00	1.600,00	187,00	3.740,00	267,00	5.340,00
Requadro de Esquadrias	43,00	m	60,00	2.580,00	20,00	860,00	80,00	3.440,00
Divisória de Gesso Acartonado ST com Isolamento	95,00	m2	50,00	4.750,00	175,00	16.625,00	225,00	21.375,00
Divisória de Gesso Acartonado RU com Isolamento	22,00	m2	50,00	1.100,00	185,00	4.070,00	235,00	5.170,00
Revestimento com Azulejo	166,00	m2	45,00	7.470,00	130,00	21.580,00	175,00	29.050,00
Soleira de Concreto L=30cm	12,00	m	150,00	1.800,00	60,00	720,00	210,00	2.520,00
Soleira de Granito L=35cm	12,00	m	150,00	1.800,00	250,00	3.000,00	400,00	4.800,00
05. PISO				35.210,00		151.670,00	1.490,00	166.890,00
Regularização de Laje	252,00	m2	60,00	15.120,00	45,00	11.340,00	105,00	26.460,00
Preparo da Superfície para Instalação de Piso Vinílico	222,00	m2	25,00	5.550,00	40,00	8.880,00	65,00	14.430,00
Piso em Manta Vinílica com Rodapé	222,00	m2	50,00	11.100,00	450,00	99.900,00	500,00	111.000,00
Piso Cerâmico	30,00	m2	45,00	1.350,00	175,00	5.250,00	220,00	6.600,00
Soleira de Granito L=15cm	14,00	m	150,00	2.100,00	450,00	6.300,00	600,00	8.400,00
06. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 35.367,00		R\$ 57.258,00	R\$ 9.840,00	R\$ 92.625,00
06.01 Rede de Água Fria								
Rede PVC Soldável 25mm	168,00	m	60,00	10.080,00	20,00	3.360,00	80,00	13.440,00
Rede PVC Soldável 32mm	36,00	m	60,00	2.160,00	40,00	1.440,00	100,00	3.600,00
Rede PVC Soldável 50mm	42,00	m	60,00	2.520,00	68,00	2.856,00	128,00	5.376,00
06.02 Rede de Esgoto								
Rede de PVC Leve 40 mm	42,00	m	60,00	2.520,00	32,00	1.344,00	92,00	3.654,00
Rede de PVC Leve 50 mm	84,00	m	60,00	5.040,00	57,00	4.788,00	117,00	9.228,00
Rede de PVC Leve 100 mm	30,00	m	60,00	1.800,00	98,00	2.940,00	156,00	4.740,00
06.03 Louças e Metais								
Lavatório com Cuba de Embutir	7,00	un	300,00	2.100,00	650,00	4.550,00	950,00	6.650,00
Bacia Sanitária com Caixa Acoplada	5,00	un	300,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00	1.300,00	6.500,00
Chuveiro	4,00	un	300,00	1.200,00	250,00	1.000,00	550,00	2.200,00
Barra de Apoio 40cm	10,00	un	150,00	1.500,00	110,00	1.100,00	260,00	2.600,00
Barra de Apoio 80cm	15,00	un	150,00	2.250,00	165,00	2.475,00	315,00	4.725,00
Cadeira para Banho Retrátil em Inox	4,00	un	150,00	600,00	750,00	3.000,00	900,00	3.600,00
Bancada de Granito	7,00	m2	200,00	1.400,00	2.000,00	14.000,00	2.200,00	15.400,00
Bancada de Inox com 3 Cubas em Inox + Balcão em MDF (Posto de Enfermagem)	4,27	m2	100,00	427,00	1.500,00	6.405,00	1.600,00	6.832,00
Ponto de Água e Esgoto para Instalação de Lavatório	3,00	un	90,00	270,00	1000,00	3.000,00	1.090,00	3.270,00
07. IMPERMEABILIZAÇÃO				58.525,00		18.035,00	1.970,00	74.560,00
Impermeabilização com Sistema Cristalizante	74,00	m2	450,00	33.300,00	100,00	7.400,00	550,00	40.700,00
Impermeabilização Semi-flexível	49,00	m2	350,00	17.150,00	90,00	4.410,00	440,00	21.560,00
Regularização de Laje	12,00	m2	250,00	3.000,00	300,00	3.600,00	550,00	6.600,00
Impermeabilização com Endurís	12,00	m2	150,00	1.800,00	100,00	1.200,00	250,00	3.000,00

DS
 PTT

Impermeabilização com Membrana Polimérica (Soleiras e Peitoris)	15,00	m	85,00	1.275,00	95,00	1.425,00	180,00	2.700,00
08. ESQUADRIAS				5.680,00		125.543,00	56.485,00	131.223,00
P01 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 140x210 (Com Chapa de Inox e Cantoneiras nos	3,00	un	150,00	450,00	6.500,00	19.500,00	6.650,00	19.950,00
P03 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 2 Fls. Val e Vem 160x210 (Com Chapa de Inox e	1,00	un	150,00	150,00	8.745,00	8.745,00	8.895,00	8.895,00
P04 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 110x210 (Com Chapa de Inox e Cantoneiras nos	3,00	un	150,00	450,00	3.742,00	11.226,00	3.892,00	11.676,00
P05 - Porta de Madeira Semi-Oca de Correr 100x210 (Com Chapa de Inox e Cantoneiras nos	2,00	un	170,00	340,00	3.572,00	7.144,00	3.742,00	7.484,00
P06 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 100x210 (Com Chapa de Inox e Cantoneiras nos	4,00	un	150,00	600,00	3.200,00	12.800,00	3.350,00	13.400,00
P07 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 130x210 (Com Chapa de Inox e Cantoneiras nos	1,00	un	150,00	150,00	5.100,00	5.100,00	5.250,00	5.250,00
P08 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 80x210 (Com Chapa de Inox e Cantoneiras nos	4,00	un	150,00	600,00	2.619,00	10.476,00	2.769,00	11.076,00
P10 - Porta de Vidro de Abrir 120x250	1,00	un	150,00	150,00	2.780,00	2.780,00	2.930,00	2.930,00
P12 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 120x210 (Com Chapa de Inox e Cantoneiras nos	1,00	un	150,00	150,00	5.900,00	5.900,00	6.050,00	6.050,00
J01 - Janela Alumínio + Vidro Fixa 150x130cm	1,00	un	100,00	100,00	2.980,00	2.980,00	3.080,00	3.080,00
J03 - Janela de Alumínio + Vidro Fixa 100x120cm	1,00	un	100,00	100,00	1.890,00	1.890,00	1.990,00	1.990,00
J04 - Janela Alumínio + Vidro Fixa 250x130cm	3,00	un	100,00	300,00	1.745,00	5.235,00	1.845,00	5.535,00
J08 - Janela de Alumínio + Vidro de Correr 100x130cm	1,00	un	100,00	100,00	1.290,00	1.290,00	1.390,00	1.390,00
J10 - Janela de Alumínio + Vidro Fixa 70x130cm	1,00	un	100,00	100,00	1.690,00	1.690,00	1.790,00	1.790,00
J12 - Janela de Alumínio + Vidro Maxim-Ar 130x60	1,00	un	100,00	100,00	1.187,00	1.187,00	1.287,00	1.287,00
Painel Vidro Temperado 10mm Fixo (Sala de Espera)	16,00	m2	15,00	240,00	500,00	8.000,00	515,00	8.240,00
Alçapão de Alumínio 40x40	20,00	un	80,00	1.600,00	980,00	19.600,00	1.060,00	21.200,00
09. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PPCI				120.000,00		208.522,00	317.522,00	328.522,00
Instalações Elétricas	1,00	vb	120.000,00	120.000,00	197.442,00	197.442,00	317.442,00	317.442,00
Colocação de Caixas de Elétrica	151,00	un		0,00	80,00	12.080,00	80,00	12.080,00
10. CLIMATIZAÇÃO				265.300,00		698.350,00	919.700,00	963.650,00
Rede de Dutos Etapa 2 + Circulação (Entre Etapa 01 e Etapa 02)	1,00	vb	R\$ 100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
Pré-Instalação para Splits	6,00	un	2000,00	12.000,00	3.500,00	21.000,00	5.500,00	33.000,00
Instalação de Splits	6,00	un	400,00	2.400,00	300,00	1.800,00	700,00	4.200,00
Split 9 000BTU's Quente/Frio Inverter Marca Gree	2,00	vb	150,00	300,00	3.800,00	7.600,00	3.950,00	7.900,00
Split 12 000BTU's Quente/Frio Inverter Marca Gree	3,00	un	150,00	450,00	4.350,00	13.050,00	4.500,00	13.500,00
Split 24 000BTU's Quente/Frio Inverter Marca Gree	1,00	vb	150,00	150,00	4.900,00	4.900,00	5.050,00	5.050,00
Rede de Água Gelada Principal	1,00	vb	R\$ 150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00
11. GASES MEDICINAIS				83.000,00		56.680,00	139.680,00	139.680,00
Instalações de Gases e Ar Comprimido	1,00	vb	83000,00	83.000,00	56.680,00	56.680,00	139.680,00	139.680,00
12. FORRO E ACESSÓRIOS				32.035,00		43.750,00	1.545,00	75.785,00
Forro de Gesso Acartonado	222,00	m2	45,00	9.990,00	60,00	13.320,00	105,00	23.310,00
Forro de Gesso Acartonado Resistente à Umidade	30,00	m2	45,00	1.350,00	65,00	1.950,00	110,00	3.300,00
Forro de Gesso Acartonado	28,00	m2	45,00	1.260,00	60,00	1.680,00	105,00	2.940,00
Tabeira 10cm para Forro de Gesso Acartonado	279,00	m	15,00	4.185,00	50,00	13.950,00	65,00	18.135,00
Tabeira 10cm para Forro de Gesso Acartonado	26,00	m	15,00	390,00	50,00	1.300,00	65,00	1.690,00
Mucheta de Gesso Acartonado RU	14,00	m	150,00	2.100,00	100,00	3.400,00	250,00	3.500,00
Mão de Obra para Requadro de Alçapão	20,00	un	350,00	7.000,00	30,00	600,00	380,00	7.600,00
Cantoneira	30,00	m	90,00	2.700,00	35,00	1.050,00	125,00	3.750,00
Batê Maca de PVC	34,00	m	90,00	3.060,00	250,00	8.500,00	340,00	11.560,00
13. PINTURA				93.475,00		48.645,00	313,00	142.120,00
Massa Corrida Acrílica	1.015,00	m2	40,00	40.600,00	20,00	20.300,00	60,00	60.900,00
Pintura Epóxi	763,00	m2	45,00	34.335,00	25,00	19.075,00	70,00	53.410,00
Pintura Epóxi Teto	252,00	m2	45,00	11.340,00	25,00	6.300,00	70,00	17.640,00
Textura	90,00	m2	40,00	3.600,00	18,00	1.620,00	58,00	5.220,00
Pintura Acrílica Fosca	90,00	m2	40,00	3.600,00	15,00	1.350,00	55,00	4.950,00
14. LIMPEZA DA OBRA				40.875,00		4.087,50	165,00	44.962,50
Limpeza de Obra	272,50	m2	150,00	40.875,00	15,00	4.087,50	165,00	44.962,50
15. OBRAS				0,00		0,00	0,00	233.936,34
Impostos sobre nota fiscal mão de obra								233.936,34
Total Geral				1.063.347,00		1.595.870,50	1.493.500,00	R\$ 2.893.153,84

DS




Hospital Nossa Senhora da Conceição
 OBRA: Reforma e Ampliação Uti Neonatal - Etapa 02 A + B
 LOCALIZAÇÃO: Tubarão/SC

Descrição	Qttd.	Und.	Mão-de-obra		Materiais e Equipamentos		Preço total	
			Unitári	Total	Unitári	Total	Unitário	Total
01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL				163.065,47		12.951,76		176.017,23
Administração Local da Obra	10,00	mes	9.415,37	94.153,66	492,73	4.927,30	9.908,10	99.080,96
Higiene e Segurança do Trabalho	10,00	mes	6.194,32	61.943,20	703,90	7.039,00	6.898,22	68.982,20
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	1,00	vb.	2322,87	2.322,87	492,73	492,73	2.815,60	2.815,60
Serviço de Plotagem	1,00	vb	4645,74	4.645,74	492,73	492,73	5.138,47	5.138,47
				15.718,09		49.360,99	20.038,63	65.079,07
02. SERVIÇOS PRELIMINARES								
Área de Vivência	1,00	vb	3.871,45	3.871,45	9.291,48	9.291,48	13.162,93	13.162,93
Escada Metálica	10,00	mes	0,00	0,00	1.471,15	14.711,51	1.471,15	14.711,51
Instalações Provisórias de Água e Esgoto	1,00	vb	774,29	774,29	774,29	774,29	1.548,58	1.548,58
Instalações Provisórias de Energia	1,00	vb	774,29	774,29	2.322,87	2.322,87	3.097,16	3.097,16
Tapume com Telha Metálica H=2,20m	50,00	m	92,91	4.645,74	185,83	9.291,48	278,74	13.937,22
Tapume de Chapa de Madeira	52,50	m2	92,91	4.878,03	232,29	12.195,07	325,20	17.073,09
Placa de Obra	10,00	m2	77,43	774,29	77,43	774,29	154,86	1.548,58
				149.114,39		5.714,40	12.093,28	154.828,79
03. DEMOLIÇÕES								
Demolição de Alvenaria	271,00	m2	110,75	30.014,45		0,00	110,75	30.014,45
Remoção de Piso	258,00	m2	70,46	18.178,78		0,00	70,46	18.178,78
Remoção de Rodapé	131,00	m	46,46	6.085,92		0,00	46,46	6.085,92
Demolição Azulejos	199,50	m2	38,71	7.723,54		0,00	38,71	7.723,54
Demolição de Concreto	28,50	m3	294,23	8.385,56		0,00	294,23	8.385,56
Furo Passagem de Tubulação	6,00	un	271,00	1.626,01		0,00	271,00	1.626,01
Rasgo em Alvenaria	600,00	m	21,29	12.775,79		0,00	21,29	12.775,79
Remoção de Rede Hidráulica	1,00	vb	3.871,45	3.871,45		0,00	3.871,45	3.871,45
Remoção de Porta	15,00	un	147,12	2.206,73		0,00	147,12	2.206,73
Remoção de Janela	16,00	un	147,12	2.353,84		0,00	147,12	2.353,84
Remoção de Forro	243,50	m2	20,91	5.090,57		0,00	20,91	5.090,57
Remoção de Instalações Elétricas/Gases Medicinais	1,00	vb	6504,04	6.504,04		0,00	6.504,04	6.504,04
Transporte Horizontal de Entulho	105,00	m3	185,83	19.512,11		0,00	185,83	19.512,11
Duto de Entulho	60,00	dia	0,00	0,00	95,24	5.714,40	95,24	5.714,40
Remoção de Entulho Classe A	166,00	m3	134,34	22.300,33		0,00	134,34	22.300,33
Remoção de Entulho Classe B	18,50	m3	134,34	2.485,28		0,00	134,34	2.485,28
				65.997,85		107.565,88	3.023,51	162.839,26
04. ALVENARIA/DIVISÓRIAS/REVESTIMENTOS								
Parede de Tijolos Esp. 15cm	142,00	m2	133,18	18.911,26	108,15	15.357,70	241,33	34.268,96
Vergas e Contravergas	46,00	m	126,98	5.841,24	65,04	2.991,86	192,02	8.833,10
Reboco Interno	284,00	m2	34,07	9.675,98	92,14	26.167,90	126,21	35.843,43
Reboco Externo	20,00	m2	40,26	805,26	92,14	1.842,81	132,40	2.648,07
Requadro de Esquadrias	43,00	m	136,28	5.859,83	65,04	2.796,74	201,32	8.656,56
Divisória de Gesso Acartonado ST com Isolamento	95,00	m2	92,91	8.826,91	307,39	29.202,35	400,31	38.029,25
Divisória de Gesso Acartonado RU com Isolamento	22,00	m2	92,91	2.044,13	330,00	7.260,05	422,92	9.304,18
Revestimento com Azulejo	166,00	m2	126,98	21.079,27	65,04	10.796,70	192,02	31.875,97
Soleira de Concreto L=30cm	12,00	m	92,91	1.114,98	472,32	5.667,80	565,23	6.782,78
Soleira de Granito L=35cm	12,00	m	92,91	1.114,98	456,83	5.481,97	549,75	6.596,95
				33.270,24		199.980,81	1.909,54	283.251,05
05. PISO								
Regularização de Laje	252,00	m2	120,79	30.433,89	126,70	31.928,90	247,49	62.362,79
Preparação da Superfície para Instalação de Piso Vinílico	222,00	m2	92,91	20.627,09	18,30	4.062,91	111,22	24.690,00
Piso Lanta Vinílica com Rodapé	222,00	m2	120,79	26.815,21	701,08	155.640,74	821,87	182.455,95
Piso Cerâmico	30,00	m2	136,28	4.088,25	84,47	2.534,04	220,74	6.622,29
Soleira de Granito L=15cm	14,00	m	92,91	1.300,81	415,30	5.814,21	508,22	7.115,02
				R\$ 74.475,08		R\$ 106.916,92	R\$ 14.172,32	R\$ 181.392,00
06. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
06.01 Rede de Água Fria								
Rede PVC Soldável 25mm	168,00	m	116,14	19.512,11	137,96	23.178,02	254,11	42.690,13
Rede PVC Soldável 32mm	36,00	m	116,14	4.181,17	137,96	4.966,72	254,11	9.147,88
Rede PVC Soldável 50mm	42,00	m	116,14	4.878,03	137,96	5.794,50	254,11	10.672,53
06.02 Rede de Esgoto								
Rede de PVC Leve 40 mm	42,00	m	116,14	4.878,03	137,96	5.794,50	254,11	10.672,53
Rede de PVC Leve 50 mm	84,00	m	116,14	9.756,05	137,96	11.589,01	254,11	21.345,06
Rede de PVC Leve 100 mm	30,00	m	131,63	3.948,88	137,96	4.138,93	269,59	8.087,81
06.03 Louças e Metais								
Lavatório com Cuba de Embutir	7,00	un	542,00	3.794,02	1.267,02	8.869,14	1.809,02	12.663,16
Baria Sanitária com Caixa Acopiada	5,00	un	542,00	2.710,02	1.267,02	6.335,10	1.809,02	9.045,12
Chuveiro	4,00	un	542,00	2.168,01	337,87	1.351,49	879,88	3.519,50
Barra de Apoio 40cm	10,00	un	487,80	4.878,03	664,48	6.644,82	1.152,28	11.522,84
Barra de Apoio 80cm	15,00	un	487,80	7.317,04	644,77	9.671,59	1.132,58	16.983,63
Cadeira para Banho Retrátil em Inox	4,00	un	0,00	0,00	774,29	3.097,16	774,29	3.097,16
Bancada de Granito	7,00	m2	387,15	2.710,02	886,91	6.208,40	1.274,06	8.918,41
Bancada de Inox com 3 Cubas em Inox + Balcão em MDF (Posto de Enfermagem)	4,27	m2	387,15	1.653,11	886,91	3.787,12	1.274,06	5.440,23
Ponto de Água e Esgoto para Instalação de Lavatório	3,00	un	636,86	2.090,58	1830,14	5.490,42	2.527,00	7.581,00
				31.433,08		38.276,08	1.825,64	69.711,16
07. IMPERMEABILIZAÇÃO								

DS
 PTT

Impermeabilização com Sistema Cristalizante	74,00	m2	213,70	15.814,10	211,17	15.626,58	424,87	31.440,68
Impermeabilização Semi-flexível	49,00	m2	213,70	10.471,50	351,95	17.245,55	565,65	27.717,05
Regularização de Laje	12,00	m2	92,91	1.114,98	161,90	1.942,76	254,81	3.057,74
Impermeabilização com Enduris	12,00	m2	219,90	2.638,78	183,01	2.196,17	402,91	4.834,95
Impermeabilização com Membrana Polimérica (Soleiras e Peitoris)	15,00	m	92,91	1.393,72	84,47	1.267,02	177,38	2.660,74

				33.186,07	3.660,28	124.694,48	66.614,28	157.880,55
08. ESQUADRIAS								
P01 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 140x210 (Com Chapa de Inóx e Cantoneiras nos	3,00	un	867,20	2.601,61	3.660,28	10.980,84	4.527,48	13.582,45
P03 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 2 Fls. Vai e Vem 160x210 (Com Chapa de Inóx e	1,00	un	619,43	619,43	3.941,84	3.941,84	4.561,27	4.561,27
P04 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 110x210 (Com Chapa de Inóx e Cantoneiras nos	3,00	un	867,20	2.601,61	3.237,94	9.713,82	4.105,14	12.315,43
P05 - Porta de Madeira Semi-Oca de Correr 100x210 (Com Chapa de Inóx e Cantoneiras nos	2,00	un	805,26	1.610,52	3.237,94	6.475,88	4.043,20	8.086,40
P06 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 100x210 (Com Chapa de Inóx e Cantoneiras nos	4,00	un	712,35	2.849,39	3.378,72	13.514,88	4.091,07	16.364,27
P07 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 130x210 (Com Chapa de Inóx e Cantoneiras nos	1,00	un	1076,26	1.076,26	3.237,94	3.237,94	4.314,20	4.314,20
P08 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 80x210 (Com Chapa de Inóx e Cantoneiras nos	4,00	un	712,35	2.849,39	3.237,94	12.951,76	3.950,29	15.801,15
P10 - Porta de Vidro de Abrir 120x250	1,00	un	905,92	905,92	3.026,77	3.026,77	3.932,69	3.932,69
P12 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 120x210 (Com Chapa de Inóx e Cantoneiras nos	1,00	un	712,35	712,35	3.237,94	3.237,94	3.950,29	3.950,29
J01 - Janela Alumínio + Vidro Fixa 150x130cm	1,00	un	1099,49	1.099,49	3.730,67	3.730,67	4.830,16	4.830,16
J03 - Janela de Alumínio + Vidro Fixa 100x120cm	1,00	un	1006,58	1.006,58	3308,33	3.308,33	4.314,91	4.314,91
J04 - Janela Alumínio + Vidro Fixa 250x130cm	3,00	un	1935,73	5.807,18	5.420,03	16.260,09	7.355,76	22.067,27
J08 - Janela de Alumínio + Vidro de Correr 100x130cm	1,00	un	1053,03	1.053,03	3.485,71	3.485,71	4.538,75	4.538,75
J10 - Janela de Alumínio + Vidro Fixa 70x130cm	1,00	un	665,89	665,89	2.681,86	2.681,86	3.347,75	3.347,75
J12 - Janela de Alumínio+Vidro Maxim-Ar 130x60	1,00	un	665,89	665,89	2.298,94	2.298,94	2.964,83	2.964,83
Painel Vidro Temperado 10mm Fixo (Sala de Espera)	16,00	m2	92,91	1.486,64	612,39	9.798,29	705,31	11.284,92
Alçapão Alumínio 40x40	20,00	un	278,74	5.574,89	802,45	16.048,92	1.081,19	21.623,81
09. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PPCI				351.198,59		135.908,22	135.908,22	484.183,86
Instalações Elétricas	1,00	vb	348.275,64	348.275,64	23,93	3.613,82	43,29	6.536,77
Colocação de Caixas de Elétrica	151,00	un	19,36	2.922,94		193.908,79	261.664,79	284.051,48
10. CLIMATIZAÇÃO				90.152,70		31.027,12	31.027,12	107.893,00
Rede de Dutos Etapa 2 + Circulação (Entre Etapa 01 e Etapa 02)	1,00	vb	76865,88	76.865,88				
Pré-Instalação para Splits	6,00	un	542,00	3.252,02	253,40	1.520,42	795,41	4.772,44
Instalação de Splits	6,00	un	929,15	5.574,89	253,40	1.520,42	1.182,55	7.095,31
Split 9.000BTU's Quente/Frio Inverter Marca Gree	2,00	vb	743,32	1.486,64	3.237,94	6.475,88	3.981,26	7.962,52
Split 12.000BTU's Quente/Frio Inverter Marca Gree	3,00	un	743,32	2.229,96	3.519,50	10.558,50	4.262,82	12.788,46
Split 24.000BTU's Quente/Frio Inverter Marca Gree	1,00	vb	743,32	743,32	6.898,22	6.898,22	7.641,54	7.641,54
Rede de Água Gelada Principal	1,00	vb	0,00	0,00	135.908,22	135.908,22	135.908,22	135.908,22
11. GASES MEDICINAIS				380.795,82		135.711,92	135.711,92	516.507,74
Instalações de Gases e Ar Comprimido	1,00	vb	380.795,82	380.795,82		65.355,71	1.783,57	99.049,63
12. FORRO E ACESSÓRIOS				38.693,93		168,94	37.503,79	218,49
Forro de Gesso Acartonado	222,00		49,55	11.001,11	190,05	5.701,59	239,61	7.188,23
Forro de Gesso Acartonado Resistente à Umidade	30,00	m2	49,55	1.486,64	168,94	4.730,21	218,49	6.117,74
Forro de Gesso Acartonado	28,00	m2	49,55	1.387,53	36,60	10.212,18	57,59	16.066,51
Tabeira 10cm para Forro de Gesso Acartonado	279,00	m	20,98	5.854,33	36,60	951,67	57,59	1.497,24
Tabeira 10cm para Forro de Gesso Acartonado	26,00	m	20,98	545,56	36,60	2.365,10	257,21	3.600,87
Mucheta de Gesso Acartonado RU	14,00	m	88,27	1.235,77	168,94	1.548,58	619,43	12.388,64
Mão de Obra para Requadro de Alçapão	20,00	un	542,00	10.340,06	77,43	1.098,08	57,59	1.727,58
Cantoneira	30,00	m	20,98	629,50	36,60	1.244,50	57,59	1.957,93
Bate Marca de PVC	34,00	m	20,98	713,43	36,60	75.749,14	475,08	174.212,50
13. PINTURA				98.463,36		17,39	17.647,12	61,37
Massa Corrida Acrílica	1.015,00	m2	43,98	44.639,37	45,47	34.695,09	89,45	68.251,58
Pintura Epóxi	763,00	m2	43,98	33.556,49	45,47	11.458,93	89,45	22.541,81
Pintura Epóxi Teto	252,00	m2	43,98	11.082,88	87,28	7.855,52	145,36	13.081,98
Textura	90,00	m2	58,07	5.226,46	45,47	4.092,47	89,45	8.050,65
Pintura Acrílica Fosca	90,00	m2	43,98	3.958,17		3.069,00	30,62	8.343,85
14. LIMPEZA DA OBRA				5.274,85		11,26	3.069,00	30,62
Limpeza de Obra	272,50	m2	19,36	5.274,85		0,00	13.627,50	13.627,50
15. OMISSOS				13.627,50				5.420,03
Desenho As built - Projeto Arquitetônico	1,00	vb	5420,03	5.420,03			5.420,03	5.420,03
Desenho As built - Instalações complementares	1,00	vb	5420,03	5.420,03			2.787,44	2.787,44
Manuais de operação dos equipamentos	1,00	vb	2.787,44	2.787,44				2.857.522,47
Total Geral					1.589.067,02		1.258.779,92	

DS
PTT

I PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

24/04/2023




CLIENTE: Hospital Nossa Senhora da Conceição

OBRA: Reforma e Ampliação Uti Neonatal - Etapa 02 (Rev.05)

LOCALIZAÇÃO: Tubarão/SC

Descrição	Qtzda.	Und.	Mão-de-obra		Materiais e Equipamentos		Preço total	
			Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
01- ADMINISTRAÇÃO LOCAL				79.884,00				
Administração Local da Obra	6,00	mes	11.967,12	71.802,72	14.760,00	88.560,00	26.727,12	160.362,72
Higiene e Segurança do Trabalho	6,00	mes	1.346,88	8.081,28	240,00	1.440,00	1.586,88	9.521,28
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	1,00	vb	0,00	0,00	561,46	561,46	561,46	561,46
	1,00	vb	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
				10.239,76		53.278,22		63.518,03
Serviço de Plotagem	1,00	vb	2.765,38	2.765,38	30.204,12	30.204,12	32.969,50	32.969,50
02- SERVIÇOS PRELIMINARES								
Área de Vivência	6,00	mes	0,00	0,00	1.440,00	8.640,00	1.440,00	8.640,00
Escada Metálica	1,00	vb	966,82	966,82	513,18	513,18	1.480,00	1.480,00
Instalações Provisórias de Água e Esgoto	1,00	vb	1.306,56	1.306,56	1.256,88	1.256,88	2.563,44	2.563,44
Instalações Provisórias de Energia	50,00	m	30,47	1.523,71	155,83	7.791,58	186,31	9.315,29
Tapume com Telha Metálica H=2,20m	52,50	m2	70,04	3.677,29	58,52	3.072,51	128,57	6.749,80
Tapume de Chapa de Madeira	10,00	m2	0,00	0,00	180,00	1.800,00	180,00	1.800,00
				165.788,52		105.160,13		270.948,65
Placa de Obra	271,00	m2	114,44	31.013,19	6,53	1.768,28	120,96	32.781,47
03- DEMOLIÇÕES								
Demolição de Alvenaria	258,00	m2	114,44	29.525,47	19,58	5.050,35	134,01	34.575,82
Remoção de Piso	131,00	m	46,03	6.029,77	8,70	1.139,70	54,73	7.169,47
Remoção de Rodapé	199,50	m2	114,44	22.830,74	17,40	3.471,30	131,84	26.302,04
Demolição Azulejos	28,50	m3	428,76	12.219,64	263,42	7.507,50	692,18	19.727,14
Demolição de Concreto	6,00	un	202,71	1.216,24	14,50	87,00	217,21	1.303,24
Furos para Passagem de Tubulação	600,00	m	14,74	8.844,78	0,00	0,00	14,74	8.844,78
Rasgo em Alvenaria	1,00	vb	2.118,90	2.118,90	0,00	0,00	2.118,90	2.118,90
Remoção de Rede Hidráulica	15,00	un	225,63	3.384,47	0,00	0,00	225,63	3.384,47
Remoção de Porta	16,00	un	225,69	3.610,11	0,00	0,00	225,69	3.610,11
Remoção de Janela	243,50	m2	28,67	6.981,00	0,00	0,00	28,67	6.981,00
Remoção de Forro	1,00	vb	9.787,50	9.787,50	0,00	0,00	9.787,50	9.787,50
Remoção de Instalações Elétricas/Sases Medicinais	105,00	m3	100,20	10.521,45	0,00	0,00	100,20	10.521,45
Transporte Horizontal de Entulho	60,00	dia	97,05	5.823,08	58,00	3.480,00	155,05	9.303,08
Duto de Entulho	166,00	m3	62,39	10.357,14	448,00	74.368,00	510,39	84.725,14
Remoção de Entulho Classe A	18,50	m3	82,43	1.525,04	448,00	8.288,00	530,43	9.813,04
				47.101,84		55.927,68		101.029,52
04- ALVENARIA/DIVISÓRIAS/REVESTIMENTOS								
Remoção de Entulho Classe B	142,00	m2	48,44	6.879,12	56,90	8.079,52	105,34	14.958,64
Parede de Tijolos Esp. 15cm	46,00	m	59,09	2.718,32	67,08	3.085,88	126,18	5.804,20
Vergas e Contravergas	284,00	m2	53,55	15.207,77	18,73	5.320,06	72,28	20.527,83
Reboco Interno	20,00	m2	79,05	1.581,09	16,51	330,20	95,56	1.911,29
Reboco Externo	43,00	m	40,10	1.724,16	3,22	138,63	43,32	1.862,79
Requadro de Esquadrias	95,00	m2	65,15	6.189,11	138,28	13.136,63	203,43	19.325,74
Divisória de Gesso Acartonado ST com Isolamento	22,00	m2	65,15	1.433,27	173,24	3.811,21	238,39	5.244,48
Divisória de Gesso Acartonado RU com Isolamento	166,00	m2	56,19	9.328,09	107,91	17.913,38	164,11	27.241,47
Revestimento com Azulejo	12,00	m	128,85	1.546,16	79,70	956,39	208,55	2.502,55
Soleira de Concreto L=30cm	12,00	m	41,23	494,75	96,31	1.155,78	137,54	1.650,53
				41.791,44		148.107,38		189.898,82
05- PISO								
Regularização de Laje	252,00	m2	81,82	20.619,52	36,54	9.208,08	118,36	29.827,60
Preparo da Superfície para Instalação de Piso Vinílico	222,00	m2	15,24	3.383,17	91,35	20.279,70	106,59	23.662,87
Piso em Manta Vinílica com Rodapé	222,00	m2	67,82	15.055,91	510,41	113.308,80	578,22	128.364,71
Piso Cerâmico	30,00	m2	71,51	2.145,25	138,85	4.165,39	210,35	6.310,64



ENGENHARIA
CASTANHEL 40 ANOS
 Engenharia da Conceição
 OBRA: Reforma e Ampliação Uti Neonatal - Etapa 02 (Rev.05)
 LOCALIZAÇÃO: Tubarão/SC

I PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



2410410003

Destinação	Qtde.	Und.	Mão-de-obra		Materiais e Equipamentos		Preço Total	
			Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Soleira de Granito L=15cm	14,00	m	41,97	587,59	81,81	1.145,41	123,79	1.733,00
06. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				15.032,87		101.794,05		114.826,92
06.01 Rede de Água Fria				4.075,74		2.356,10		6.431,84
Rede de PVC Leve 40 mm	168,00	m	14,56	2.446,72	5,76	968,15	20,33	3.414,87
Rede PVC Soldável 25mm	36,00	m	16,99	611,61	13,17	474,28	30,16	1.085,89
Rede PVC Soldável 32mm	42,00	m	24,22	1.017,41	21,75	913,67	45,98	1.931,08
Rede PVC Soldável 50mm				3.006,25		2.487,05		5.493,30
06.02 Rede de Esgoto				641,28		427,69		1.068,97
Rede de PVC Leve 40 mm	42,00	m	15,27	641,28	10,18	427,69	25,45	1.068,97
Rede de PVC Leve 50 mm	84,00	m	15,27	1.282,55	16,38	1.376,17	31,65	2.658,72
Rede de PVC Leve 100 mm	30,00	m	36,08	1.082,42	22,77	683,19	58,85	1.765,61
06.03 Louças e Metais				5.950,88		96.950,90		102.901,78
Lavatório com Cuba de Embutir	7,00	un	234,90	1.644,30	1.115,63	7.809,41	1.350,53	9.453,71
Bacia Sanitária com Caixa Acoplada	5,00	un	234,90	1.174,50	2.808,76	14.043,80	3.043,66	15.218,30
Chuveiro	4,00	un	234,90	939,60	657,11	2.628,45	892,01	3.568,05
Barra de Apoio 40cm	10,00	un	29,45	294,50	547,68	5.476,80	577,13	5.771,30
Barra de Apoio 80cm	15,00	un	71,11	1.066,62	601,13	9.016,90	672,23	10.083,52
Cadeira para Banho Retrátil em Inox	4,00	un	19,55	78,22	975,57	3.902,30	995,13	3.980,52
Bancada de Granito	7,00	m ²	6,92	48,44	1.087,50	7.612,50	1.094,42	7.660,94
Bancada de Inox com 3 Cubas em Inox + Balcão em MDF (Posto de Enfermagem)	4,27	m ²	0,00	0,00	10.200,00	43.554,00	10.200,00	43.554,00
Ponto de Água e Esgoto para Instalação de Lavatório	3,00	un	234,90	704,70	968,91	2.906,74	1.203,81	3.611,44

DIS
 PTH



I PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ENGENHARIA
CASTANHEIRA
40 ANOS
OBRAS: Reforma e Ampliação Uti Neonatal - Etapa 02 (Rev.05)
LOCALIZAÇÃO: Tubarão/SC

Descrição	Qtda.	Und.	Mão-de-obra		Materiais e Equipamentos		Preço total	
			Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
07. IMPERMEABILIZAÇÃO				10.024,37				
Impermeabilização com Sistema Cristalizante	74,00	m2	87,81	6.497,79	11,11	822,04	98,92	7.319,83
Impermeabilização Semi-flexível	49,00	m2	21,00	1.029,00	88,20	4.321,80	109,20	5.350,80
Regularização de Laje	12,00	m2	81,82	981,88	36,54	438,48	118,36	1.420,36
Impermeabilização com Endurís	12,00	m2	115,81	1.389,70	159,09	1.909,07	274,90	3.298,77
Impermeabilização com Membrana Polimérica (Soleiras e Peitoris)	15,00	m	8,40	126,00	5,84	87,54	14,24	213,54
08. ESQUADRIAS				8.265,50		110.245,88		118.509,36
P01 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 140x210 (Com Chapa de Inox e Cantoneiras nos Dois Lados)	3,00	un	132,83	398,50	3.714,95	11.144,85	3.847,78	11.543,85
P03 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 2 Fls. Vai e Vem 160x210 (Com Chapa de Inox e Cantoneiras nos Dois Lados)	1,00	un	265,66	265,66	5.747,63	5.747,63	6.013,29	6.013,29
P04 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 110x210 (Com Chapa de Inox e Cantoneiras nos Dois Lados)	3,00	un	132,83	398,50	2.968,94	8.906,81	3.101,77	9.305,31
P05 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 100x210 (Com Chapa de Inox e Cantoneiras nos Dois Lados)	2,00	un	265,66	531,33	3.229,40	6.458,79	3.495,06	6.990,12
P06 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 100x210 (Com Chapa de Inox e Cantoneiras nos Dois Lados)	4,00	un	132,83	531,33	2.967,60	11.870,39	3.100,43	12.401,72
P07 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 130x210 (Com Chapa de Inox e Cantoneiras nos Dois Lados)	1,00	un	265,66	265,66	3.713,61	3.713,61	3.979,28	3.979,27
P08 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 80x210 (Com Chapa de Inox e Cantoneiras nos Dois Lados)	4,00	un	132,83	531,33	2.842,42	11.369,68	2.975,25	11.901,01
P10 - Porta de Vidro de Abrir 120x250	1,00	un	265,66	265,66	3.944,23	3.944,23	4.209,90	4.209,89
P12 - Porta de Madeira Semi-Oca de Abrir 120x210 (Com Chapa de Inox e Cantoneiras nos Dois Lados)	1,00	un	199,25	199,25	3.432,27	3.432,27	3.631,52	3.631,52
J01 - Janela Alumínio + Vidro Fixa 150x130cm	1,00	un	211,04	211,04	3.055,78	3.055,78	3.266,82	3.266,82
J03 - Janela Alumínio + Vidro Fixa 100x120cm	1,00	un	211,04	211,04	996,60	996,60	1.207,64	1.207,64
J04 - Janela Alumínio + Vidro Fixa 250x130cm	3,00	un	211,04	633,11	5.040,38	15.121,13	5.251,41	15.754,24
J08 - Janela Alumínio + Vidro de Correr 100x130cm	1,00	un	211,04	211,04	1.222,17	1.222,17	1.433,21	1.433,21
J10 - Janela Alumínio + Vidro Fixa 70x130cm	1,00	un	211,04	211,04	1.468,12	1.468,12	1.679,16	1.679,16
J12 - Janela Alumínio + Vidro Maxim-Air 130x60	1,00	un	211,04	211,04	637,00	637,00	848,04	848,04
Painel Vidro Temperado 10mm Frio (Sala de Espera)	16,00	m2	33,21	531,33	744,80	11.916,80	778,01	12.448,13
Alçapão de Alumínio 40x40	20,00	un	132,83	2.656,64	462,00	9.240,00	594,83	11.896,64
09. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PPCI				80.123,96		146.250,00		226.373,96
Instalações Elétricas	1,00	vb	70.200,00	70.200,00	146.250,00	146.250,00	216.450,00	216.450,00
Colocação de Caixas de Elétrica	151,00	un	65,72	9.923,96	0,00	0,00	65,72	9.923,96

DIS
RHT



**ENGENHARIA
CASTANHEIRA** 1980 ANOS
Engenharia de Concelção
OBRA: Reforma e Ampliação, Uti Neonatal - Etapa 02 (Rev.05)
LOCALIZAÇÃO: Tubarão/SC

I PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Descrição	Qtda.	Unid.	Mão-de-obra		Materiais e Equipamentos		Preço total	
			Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
20. CLIMATIZAÇÃO				0,00		579.776,04		579.776,04
Rede de Dutos Etapa 2 + Circulação [Entre Etapa 01 e Etapa 02]	1,00	vb	0,00	0,00	171.408,34	171.408,34	171.408,34	171.408,34
Pré-Instalação para Splits	6,00	un	0,00	0,00	3.016,00	18.096,00	3.016,00	18.096,00
Instalação de Splits	6,00	un	0,00	0,00	1.690,00	10.140,00	1.690,00	10.140,00
Split 9.000BTU's Quente/Frio Inverter Marca Gree	2,00	vb	0,00	0,00	2.587,00	5.174,00	2.587,00	5.174,00
Split 12.000BTU's Quente/Frio Inverter Marca Gree	3,00	un	0,00	0,00	2.996,50	8.989,50	2.996,50	8.989,50
Split 24.000BTU's Quente/Frio Inverter Marca Gree	1,00	vb	0,00	0,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00
Rede de Água Gelada Principal	1,00	vb	0,00	0,00	360.261,20	360.261,20	360.261,20	360.261,20
21. GASES MEDICINAIS				0,00		114.098,99		114.098,99
Instalações de Gases e Ar-Comprimido	1,00	vb	0,00	0,00	114.098,99	114.098,99	114.098,99	114.098,99
22. FORRO E ACESSÓRIOS				28.645,15		50.764,99		79.410,14
Forro de Gesso Acartonado	222,00	m2	37,80	8.391,60	89,81	19.939,44	127,62	28.331,04
Forro de Gesso Acartonado Resistente à Umidade	30,00	m2	37,80	1.134,00	108,19	3.245,81	145,99	4.379,81
Forro de Gesso Acartonado	28,00	m2	37,80	1.058,40	89,81	2.514,89	127,62	3.573,29
Tabeira 10cm para Forro de Gesso Acartonado	279,00	m	47,16	13.156,38	27,74	7.740,30	74,90	20.896,68
Tabeira 10cm para Forro de Gesso Acartonado	26,00	m	47,16	1.226,04	27,74	721,32	74,90	1.947,36
Mucheta de Gesso Acartonado RU	14,00	m	37,80	529,20	124,68	1.745,48	162,48	2.274,68
Mão de Obra para Requadro de Alçapão	20,00	un	87,75	1.755,00	0,00	0,00	87,75	1.755,00
Cantoneira	30,00	m	142,88	4.286,52	0,00	0,00	142,88	4.286,52
Batê Maca de PVC	34,00	m	41,02	1.394,53	310,92	10.571,23	351,93	11.965,76
23. PINTURA				58.764,42		31.619,70		90.384,12
Massa Corrida Acrílica	1.015,00	m2	27,00	27.405,00	9,68	9.819,32	36,67	37.224,32
Pintura Epóxi	763,00	m2	22,95	17.510,85	23,64	18.036,18	46,59	35.547,03
Pintura Epóxi Teto	252,00	m2	24,10	6.072,57	8,83	2.223,22	32,92	8.295,79
Textura	90,00	m2	40,50	3.645,00	5,31	477,62	45,81	4.122,62
Pintura Acrílica Fosca	90,00	m2	45,90	4.131,00	11,82	1.063,36	57,72	5.194,36
24. LIMPEZA DA OBRA				2.456,86		763,00		3.219,86
Limpeza de Obra	272,50	m2	9,02	2.456,86	2,80	763,00	11,82	3.219,86
Total Geral com Desconto para Estufamento Direto				546.116,69		1.594.286,48		2.140.403,17

Este documento não pode ser divulgado ou reproduzido no todo, ou em parte, sem o expresso consentimento da Engenharia Castanheira, conforme a lei nº 9.610/1988 e a resolução nº 1.029/10 do Conselho

DS
[Handwritten signature]

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C9ABD3DFF9ED48B1B72D85745A797546
 Assunto: Complete com a DocuSign: Ofício nº 29_Nas Mãos de Quem Ama Fase 2 READEQUAÇÃO FINAL
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 32
 Certificar páginas: 5
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 SORAIA BITTENCOURT DA ROSA MARTINS
 Rua Cincinnati Braga, 144 – Bela Vista.
 SP, SP 01333-010.
 soraiamartins@hns.org.br
 Endereço IP: 189.22.68.114

Rastreamento de registros

Status: Original
 30/01/2023 04:52:07


Portador: SORAIA BITTENCOURT DA ROSA MARTINS
 soraiamartins@hns.org.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Fabio Tadeo Teixeira
 fabio.teixeira@redesc.org.br
 Diretor Executivo
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

 A0E21999A7E2430

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.124.48.212

Registro de hora e data

Enviado: 30/01/2023 05:05:16
 Reenviado: 30/01/2023 11:35:48
 Visualizado: 30/01/2023 11:37:39
 Assinado: 30/01/2023 11:39:35

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 30/01/2023 11:37:39
 ID: 8a4b711a-5750-4aaf-9a2c-42b42d66c4c9

SORAIA BITTENCOURT DA ROSA MARTINS
 soraiamartins@redesc.org.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

 2001525F0A7F4430

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 200.225.223.209

Enviado: 30/01/2023 11:39:45
 Visualizado: 30/01/2023 11:42:34
 Assinado: 30/01/2023 11:42:59

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 30/01/2023 11:42:34
 ID: 1bde742c-3704-46d0-b11f-427021e53b03

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	30/01/2023 05:05:17
Entrega certificada	Segurança verificada	30/01/2023 11:42:34
Assinatura concluída	Segurança verificada	30/01/2023 11:42:59
Concluído	Segurança verificada	30/01/2023 11:42:59

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Associacao Congregacao de Santa Catarina. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Associacao Congregacao de Santa Catarina.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: hugo.oliveira@acsc.org.br

To advise Associacao Congregacao de Santa Catarina. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at hugo.oliveira@acsc.org.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Associacao Congregacao de Santa Catarina.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to hugo.oliveira@acsc.org.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Associacao Congregacao de Santa Catarina.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to hugo.oliveira@acsc.org.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Associacao Congregacao de Santa Catarina. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Associacao Congregacao de Santa Catarina. during the course of your relationship with Associacao Congregacao de Santa Catarina..
